

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300371

Opdrachtgever: Enzerink.
Contactpersoon: Dhr. R. Enzerink.
Projectnr. 2012.023a Werkplannr. 2012.023a
Locatie adres: Woodbrookersweg 1 te Barchem.

Datum: 28-03-2012 Naam analist: 
Tijdsduur: Aankomst: 10.00 Vertrek: 13.00 Tijd op locatie: 3 uur.
Werkzaamheden: Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie
Weer: Droog en zonnig. T_{kalib} (°C): 15
P_{kalib} (hPa): 1037

Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)

Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudende stelplaatjes achter de wand.

Locatie saneringswerkzaamheden: Hoofdbouw.

Wat is er verwijderd: Ca. 26 m² wand met de asbesthoudende stelplaatjes.

Asbestsoort (gew%): 2-5 % Chrysotiel. 30-60% Amosiet.

Niet hechtgebonden.

Inventarisatierapport ingezien: Ja Bestvision, 12BV9547

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	X ja	20 m ²	O nee
Omgevingsvergunning aanwezig?	X ja		O nee
Voldoende verlichting?	X ja		O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja		X nee
Is de ruimte droog?	X ja		O nee
Is de ruimte stofvrij?	X ja		O nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	O ja		X nee
Zijn oppervlakken gefixeerd?	O ja		X nee
Sanering conform werkplan?	X ja		O nee
Opmerkingen: Deze vrijgave geldt alleen voor de verwijderde stelplaatjes.			

Locatie/bouwdeel	Aanwezig	Resultaat
Plafond (constructiedelen)	X ja O nee	+
Kabelgoten doorvoeringen	O ja X nee	
Ventilatiekanalen	O ja X nee	
Buizen	O ja X nee	
Verwarmingselementen	O ja X nee	
Kozijnen	O ja X nee	
Plinten	O ja X nee	
Vloer	X ja O nee	+
Machines, installaties	O ja X nee	
Overige, nl. steiger	X ja O nee	+
Opmerkingen:		

+ = direct in orde bevonden;
+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300371

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters
Hoofdgebouw	+	+	+	--
Niet geïnspecteerde delen: Achter afgeplakte gedeelten.				

Conclusie visuele inspectie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied is geschikt voor de uitvoering van een luchtmeting.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -25 Pa	T _{aktueel} 17 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	20	46		
Tijd start meting	10.15	10.15		
Tijd stop meting	12.15	12.15		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8.3/8.3	8.3/8.3	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)	1	3		
Vezelconcentratie (v/cm³)	0.000	0.001		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm³)			0.000-0.002	

Opmerkingen:

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm³ lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

5.1.2e

5.1.2e


5.1.2e

INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300371

Globale situatietekening

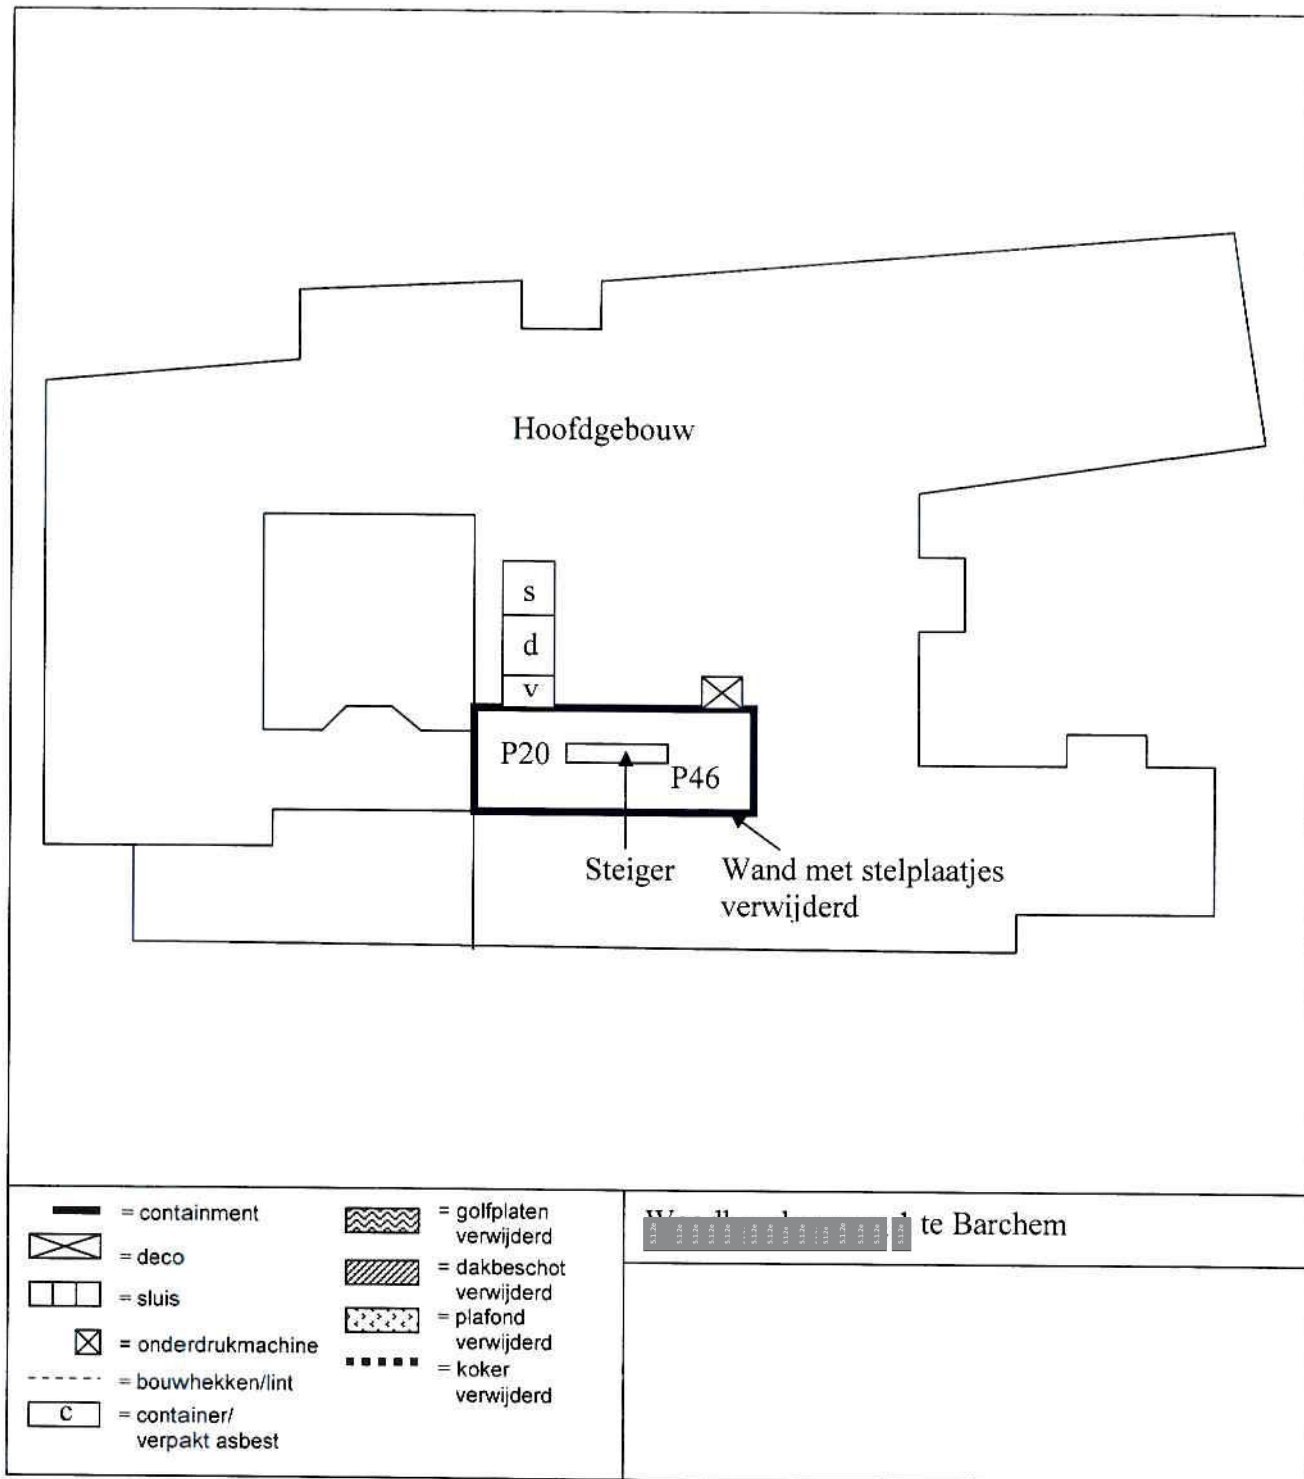

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE-INSTELLINGEN.
ONDER NR. 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE.



ACMAA ALMELO B.V. LABORATORIUM VOOR VEZELONDERZOEK

Krommendijk 20A • 7603 NK Almelo • Telefoon 0546 - 873702 • Fax 0546 - 873745
E-mail: info@acmaa-almelo.nl • Internet: www.acmaa.nl

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300007

Opdrachtgever: Enzerink
Contactpersoon: Dhr. R. Enzerink.
Projectnr. 2012.023 Werkplannr. 2012.023
Locatie adres: Woodbrookersweg 1 te Barchem.

Datum: 07-03-2012 Naam analist: 
Tijdsduur: Aankomst: 16.00 Vertrek: 19.00 Tijd op locatie: 3uur
Werkzaamheden: Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie
Weer: Bewolkt en regen. T_{kalib} (°C): 8
 P_{kalib} (hPa): 1018

Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)

Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudende vlakke plaat.

Locatie saneringswerkzaamheden: In het cv hok van huisje 1.

Wat is er verwijderd: Ca 2m²

Asbestsoort (gew%): Chrysotiel 2-5% en amosiet 30-60%

Niet Hechtgebonden.

Inventarisatierapport ingezien: Ja Acmaa I11467.

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	X ja	3m ² O nee
Omgevingsvergunning aanwezig?	X ja	O nee
Voldoende verlichting?	X ja	O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja	X nee
Is de ruimte droog?	X ja	O nee
Is de ruimte stofvrij?	X ja	O nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	O ja	X nee
Zijn oppervlakken gefixeerd?	O ja	X nee
Sanering conform werkplan?	X ja	O nee
Opmerkingen: Deze vrijgave geldt alleen voor het verwijderde plafondplaatje in de cv ruimte van huisje 1.		

Locatie/bouwdeel	Aanwezig	Resultaat
Plafond (constructiedelen)	X ja O nee	+
Kabelgoten doorvoeringen	O ja X nee	
Ventilatiekanalen	O ja X nee	
Buizen	O ja X nee	
Verwarmingselementen	O ja X nee	
Kozijnen	O ja X nee	
Pliinten	O ja X nee	
Vloer	X ja O nee	+
Machines, installaties	O ja X nee	
Overige, nl.	O ja X nee	
Opmerkingen: Naden en kieren tot visuele diepte geïnspecteerd.		

+ = direct in orde bevonden.

+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;

A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RVA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLING
ONDER NR. L376 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300007

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters
Huisje 1	+	+	+	--

Niet geïnspecteerde delen: Achter afgeplakte gedeelten.

Conclusie visuele inspectie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied is geschikt voor de uitvoering van een luchtmeting.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -22 Pa	T _{aktueel} 11 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	20	44		
Tijd start meting	16.05	16.05		
Tijd stop meting	18.05	18.05		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8.3/8.3	8.3/8.3	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)	2	2		
Vezelconcentratie (v/cm ³)	0.001	0.001		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm ³)			0.000-0.002	

Opmerkingen:

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm³ lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

5.1.2e



5.1.2e

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300385a

Opdrachtgever: Enzerink
Contactpersoon: Dhr. R. Enzerink
Projectnr. 2012.023 Werkplannr. 2012.023
Locatie adres: Woodbrookersweg 1 huisje 4 te Barchem.

Datum: 23-03-2012 Naam analist: 
Tijdsduur: Aankomst: 9.45 Vertrek: 12.45 Tijd op locatie: 3uur
Werkzaamheden: Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie
Weer: Droog en zonnig. T_{kalib} (°C): 12
P_{kalib} (hPa): 1031

Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)

Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudende vlakke plaat.

Locatie saneringswerkzaamheden: In het cv hok plafondbeplating in huisje 4.

Wat is er verwijderd: Ca 2m².

Asbestsoort (gew%): Chrysotiel 2-5% en amosiet 30-60%.

Niet hechtgebonden.

Inventarisatierapport ingezien: Ja Bestvision 12BV9546.

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	X ja 4m ² O nee
Omgevingsvergunning aanwezig?	X ja O nee
Voldoende verlichting?	X ja O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja X nee
Is de ruimte droog?	X ja O nee
Is de ruimte stofvrij?	X ja O nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	O ja X nee
Zijn oppervlakken gefixeerd?	O ja X nee
Sanering conform werkplan?	X ja O nee
Opmerkingen: Deze vrijgave geldt alleen voor de verwijderde plafondbeplating in huisje 4.	

Locatie/bouwdeel	Aanwezig	Resultaat
Plafond (constructiedelen)	X ja O nee	+
Kabelgoten doorvoeringen	O ja X nee	
Ventilatiekanalen	O ja X nee	
Buizen	O ja X nee	
Verwarmingselementen	O ja X nee	
Kozijnen	O ja X nee	
Plinten	O ja X nee	
Vloer	X ja O nee	+
Machines, installaties	X ja O nee	+
Overige, nl.	O ja X nee	
Opmerkingen: Naden en kieren tot visuele diepte geïnspecteerd.		

- + = direct in orde bevonden;
+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300385a

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegde delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleeft monsters
CV hok	+	+	+	--
Niet geïnspecteerde delen: Achter afgeplakte gedeelten.				

Conclusie visuele inspectie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied is geschikt voor de uitvoering van een luchtmeting.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -25 Pa	T _{aktueel} 12 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	50	46		
Tijd start meting	9.50	9.50		
Tijd stop meting	11.50	11.50		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8.3/8.3	8.3/8.3	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)	1	2		
Vezelconcentratie (v/cm³)	0.000	0.001		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm³)			0.000-0.002	

Opmerkingen:

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm³ lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

5.1.2e


5.1.2e

INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300385a

Globale situatietekening

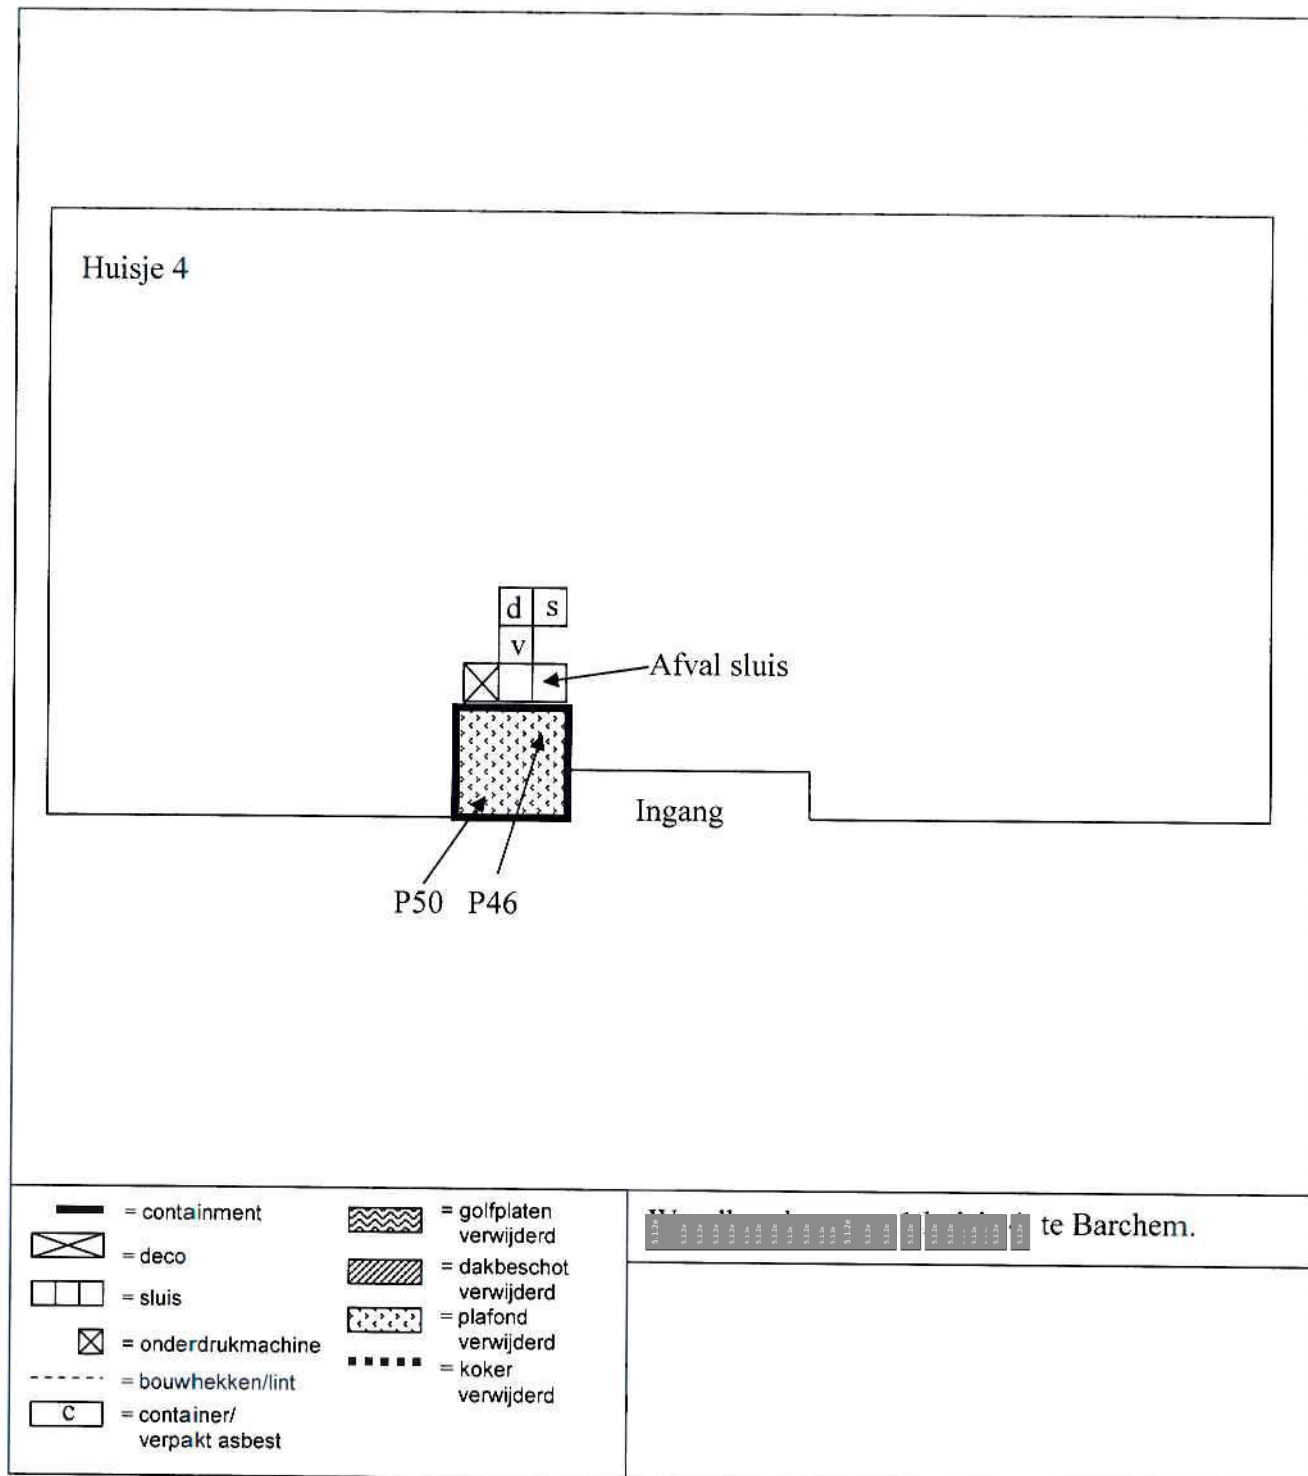

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
ONDER NR. 1176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 2

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300385b

Opdrachtgever Enzerink
Contactpersoon Dhr. R. Enzerink
Projectnr. 2012.023 Werkplannr. 2012.023
Locatie adres Woodbrookersweg 1 huisje 4 te Barchem.

Datum 23-03-2012 Naam analist [REDACTED]
Tijdsduur Aankomst 9.45 Vertrek 12.45 Tijd op locatie 3uur
Werkzaamheden Omgevingsluchtmeting na asbestsanering Binnensituatie
Weer Droog en zonnig. T_{kalib} (°C) 12
P_{kalib} (hPa) 1031

LUCHTMETING

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -- Pa	T _{aktueel} 12 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	37	25		
Tijd start meting	9.47	9.47		
Tijd stop meting	11.47	11.47		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8.3/8.3	8.3/8.3	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100	100	
Aantal getelde vezels (v)	0	1		
Vezelconcentratie (v/ml)	0.000	0.000		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/ml)			0.000-0.001	

Opmerkingen: Het betreft een achtergrondmeting bij de sluis van een klasse 3 sanering.

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de omgevingslucht van de aangrenzende ruimte van de asbestsanering, op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval, NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/ml lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

R. Kingma

5.1.2e

5.1.2e

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300385

Opdrachtgever: Enzerink
Contactpersoon: Dhr. R. Enzerink
Projectnr. 2012.023 Werkplannr. 2012.023
Locatie adres: Woodbrookersweg 1 huisje 4 te Barchem.

Datum: 23-03-2012 Naam analist: 
Tijdsduur: Aankomst: 9.45 Vertrek: 12.45 Tijd op locatie: 3uur
Werkzaamheden: Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie
Weer: Droog en zonnig. T_{kalib} (°C): 12
P_{kalib} (hPa): 1031

Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)

Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudend stof op de grond.
Locatie saneringswerkzaamheden: In de woning ten hoogte van KL1, KL2 en KL3 (zie inventarisatierapport).
Wat is er verwijderd: Ca 24m² vloeroppervlakte schoongemaakt.
Asbestsoort (gew%): Chrysotiel percentage niet bekend.
Hechtgebonden.
Inventarisatierapport ingezien: Ja Bestvision 12BV9546.

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	X ja	24m ² O nee
Omgevingsvergunning aanwezig?	X ja	O nee
Voldoende verlichting?	X ja	O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja	X nee
Is de ruimte droog?	X ja	O nee
Is de ruimte stofvrij?	X ja	O nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	O ja	X nee
Zijn oppervlakken gefixeerd?	O ja	X nee
Sanering conform werkplan?	X ja	O nee
Opmerkingen: Deze vrijgave geldt alleen voor de verwijderde besmetting op de vloer van huisje 4.		

Locatie/bouwdeel	Aanwezig	Resultaat
Plafond (constructiedelen)	X ja O nee	+
Kabelgoten doorvoeringen	O ja X nee	
Ventilatiekanalen	O ja X nee	
Buizen	O ja X nee	
Verwarmingselementen	O ja X nee	
Kozijnen	O ja X nee	
Plinten	O ja X nee	
Vloer	X ja O nee	+
Machines, installaties	O ja X nee	
Overige, nl.	O ja X nee	
Opmerkingen:		

+ = direct in orde bevonden;
+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
SONDER NR. 1176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300385

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleeftmonsters
Vloer huisje 4	+	+	+	KL1 en KL2
Niet geïnspecteerde delen: Achter afgeplakte gedeelten.				

Conclusie visuele inspectie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied is geschikt voor de uitvoering van een luchtmeting.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -20 Pa	T _{aktueel} 12 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	20	53		
Tijd start meting	10.15	10.15		
Tijd stop meting	12.15	12.15		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8.3/8.3	8.3/8.3	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)	1	1		
Vezelconcentratie (v/cm³)	0.000	0.000		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm³)			0.000-0.002	


Opmerkingen: Op KL1 en KL2 zijn geen asbestiforme vezels aangetroffen.

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm³ lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA'er opdrachtgever




INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300385

Globale situatietekening

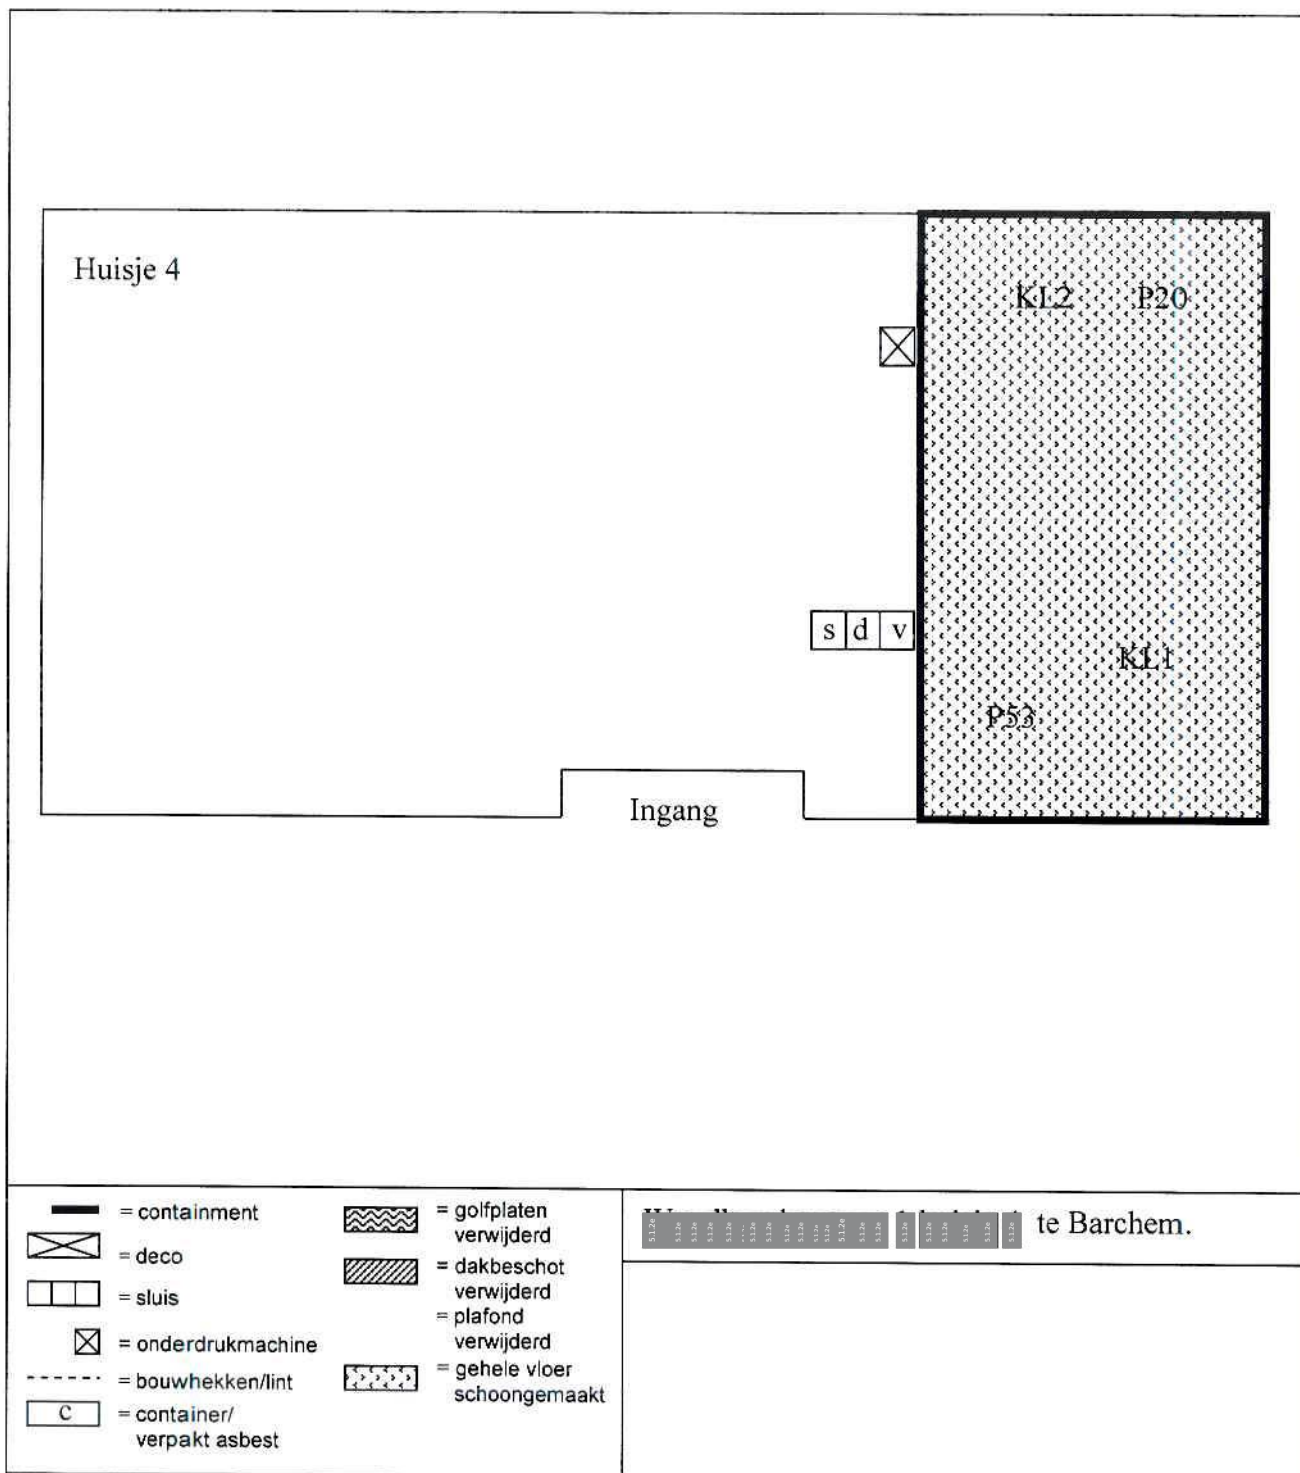

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
ONDER NR. 1175 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200292

Opdrachtgever Enzerink
Contactpersoon Dhr. R. Enzerink
Projectnr. 2012.023 .werkplan 2012.023
Locatie adres Woodbrookersweg 1 te Barchem (Slaaphuisje 3)

Datum 24-02-2012 Naam analist 
Tijdsduur Aankomst 12.35 Vertrek 15.35 Tijd op locatie 3 uur
Werkzaamheden Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie
Weer Droog en bewolkt T_{kalib} (°C) 10
 P_{kalib} (hPa) 1022

Visuele inspectie

Inventarisatierapport ingezien en zijn alle te verwijderen materialen goed beschreven: Ja, Acmaa I11467
Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudende vlakke plaat en plafondplaten
Locatie saneringswerkzaamheden: Slaaphuisje 3. Op de zolder. En plafond bij de keldertrap
Wat is er verwijderd Op de zolder < 0,5 m² vlakke plaat. Bij kelder 2 m² plafondplaat.
Asbestsoort (gew%): Zolder = Chrysotiel 2-5%. Kelder = Chrysotiel 2-5%
Hechtgebonden. Ja
Inspectiegebied: 14 m²

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	X ja, 13 m ²	O nee
Is er een sloopvergunning aanwezig	X ja	O nee
Voldoende verlichting?	X ja	O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja	X nee
Is de ruimte droog?	X ja	O nee
Is de ruimte stofvrij?	X ja	O nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	O ja	X nee
Zijn oppervlakken gefixeerd?	O ja	X nee
Werkplan in overeenstemming met te inspecteren object	X ja	O nee
Opmerkingen: De vrijgave geldt niet voor de ontluhtingspijpen op de zolder. De plaat is van boven de zolder een containment omgebouwd en daarna van onderen is het plafond en plaat verwijderd.		

Locatie/bouwdeel	Aanwezig	Resultaat
Plafond (constructiedelen)	X ja O nee	+
Kabelgoten doorvoeringen	O ja X nee	
Ventilatiekanalen	O ja X nee	
Buizen	O ja X nee	
Verwarmingselementen	O ja X nee	
Kozijnen	X ja O nee	+
Plinten	O ja X nee	
Vloer	X ja O nee	+
Machines, installaties	O ja X nee	
Overige, nl.	O ja X nee	
Opmerkingen: Naden en kieren zijn tot visuele diepte geïnspecteerd.		

+ = direct in orde bevonden.
+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200292

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters
Huis 3 zolder, kelder	+	+	+	—
Niet geïnspecteerde delen: Achter de afgeplakte delen				

Conclusie visuele inspectie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden en/of vrijgavemetingen.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -25 Pa	T _{aktueel} 9 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	62	66		
Tijd start meting	12.45	12.45		
Tijd stop meting	14.45	14.45		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8,3/8,2	8,3/8,2	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)	1	1		
Vezelconcentratie (v/cm ³)	0,000	0,000		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm ³)			0,000-0,002	

Opmerkingen:

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm³ lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

R. Plas



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RWA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONDER NR. L376 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE


INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200292

Globale situatietekening

Het huisje staat in het bos

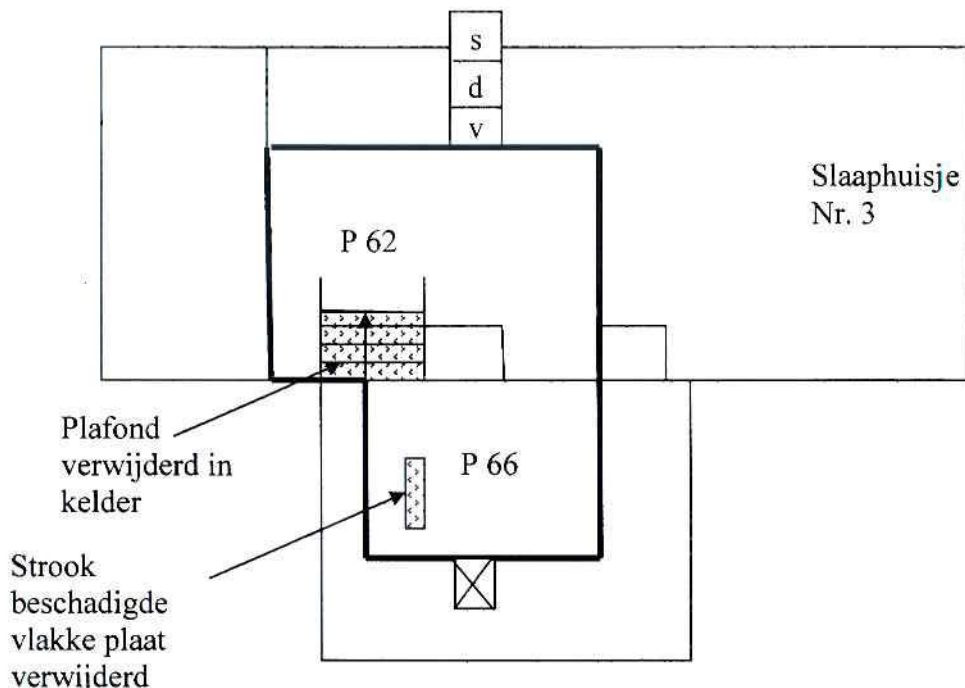

Zandweg

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| = containment | = golfplaten verwijderd |
| = deco | = dakbeschot verwijderd |
| = sluis | = plafond verwijderd |
| = onderdrukmaschine | = zeil verwijderd |
| = bouwhekken/lint | |
| = container/verpakt asbest | |

te Barchem



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONDER NR. L375 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200292

Opdrachtgever Enzerink
Contactpersoon Dhr. R. Enzerink
Projectnr. 2012.023 .werkplan 2012.023
Locatie adres Woodbrookersweg 1 te Barchem (Slaaphuisje 3)

Datum 24-02-2012 Naam analist 
Tijdsduur Aankomst 12.35 Vertrek 15.35 Tijd op locatie 3 uur
Werkzaamheden Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie
Weer Droog en bewolkt T_{kalib} (°C) 10
 P_{kalib} (hPa) 1022

Visuele inspectie

Inventarisatierapport ingezien en zijn alle te verwijderen materialen goed beschreven: Ja, Acmaa I11467
Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudende vlakke plaat en plafondplaten
Locatie saneringswerkzaamheden: Slaaphuisje 3. Op de zolder. En plafond bij de keldertrap
Wat is er verwijderd Op de zolder < 0,5 m² vlakke plaat .Bij kelder 2 m² plafondplaat.
Asbestsoort (gew%): Zolder = Chrysotiel 2-5%. Kelder = Chrysotiel 2-5%
Hechtgebonden. Ja
Inspectiegebied: 14 m²
Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	X ja, 13 m ²	O nee
Is er een sloopvergunning aanwezig	X ja	O nee
Voldoende verlichting?	X ja	O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja	X nee
Is de ruimte droog?	X ja	O nee
Is de ruimte stofvrij?	X ja	O nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	O ja	X nee
Zijn oppervlakken gefixeerd?	O ja	X nee
Werkplan in overeenstemming met te inspecteren object	X ja	O nee
Opmerkingen: De vrijgave geldt niet voor de ontluftingspijpen op de zolder. De plaat is van boven de zolder een containment omgebouwd en daarna van onderen is het plafond en plaat verwijderd.		

Locatie/bouwdeel	Aanwezig	Resultaat
Plafond (constructiedelen)	X ja O nee	+
Kabelgoten doorvoeringen	O ja X nee	
Ventilatiekanalen	O ja X nee	
Buizen	O ja X nee	
Verwarmingselementen	O ja X nee	
Kozijnen	X ja O nee	+
Plinten	O ja X nee	
Vloer	X ja O nee	+
Machines, installaties	O ja X nee	
Overige, nl.	O ja X nee	
Opmerkingen: Naden en kieren zijn tot visuele diepte geïnspecteerd.		

+ = direct in orde bevonden;
+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten, gehele ruimte reinigen



INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200292

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegde delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleeftmonsters
Huis 3 zolder, kelder	+	+	+	—
Niet geïnspecteerde delen: Achter de afgeplakte delen				

Conclusie visuele inspectie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden en/of vrijgavemetingen.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -25 Pa	T _{aktueel} 9 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	62	66		
Tijd start meting	12.45	12.45		
Tijd stop meting	14.45	14.45		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8,3/8,2	8,3/8,2	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)	1	1		
Vezelconcentratie (v/cm³)	0,000	0,000		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm³)			0,000-0,002	

Opmerkingen:

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm³ lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

5.1.2e



5.1.2e


HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RVA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA
ONDER NR. L376 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200292

Globale situatietekening

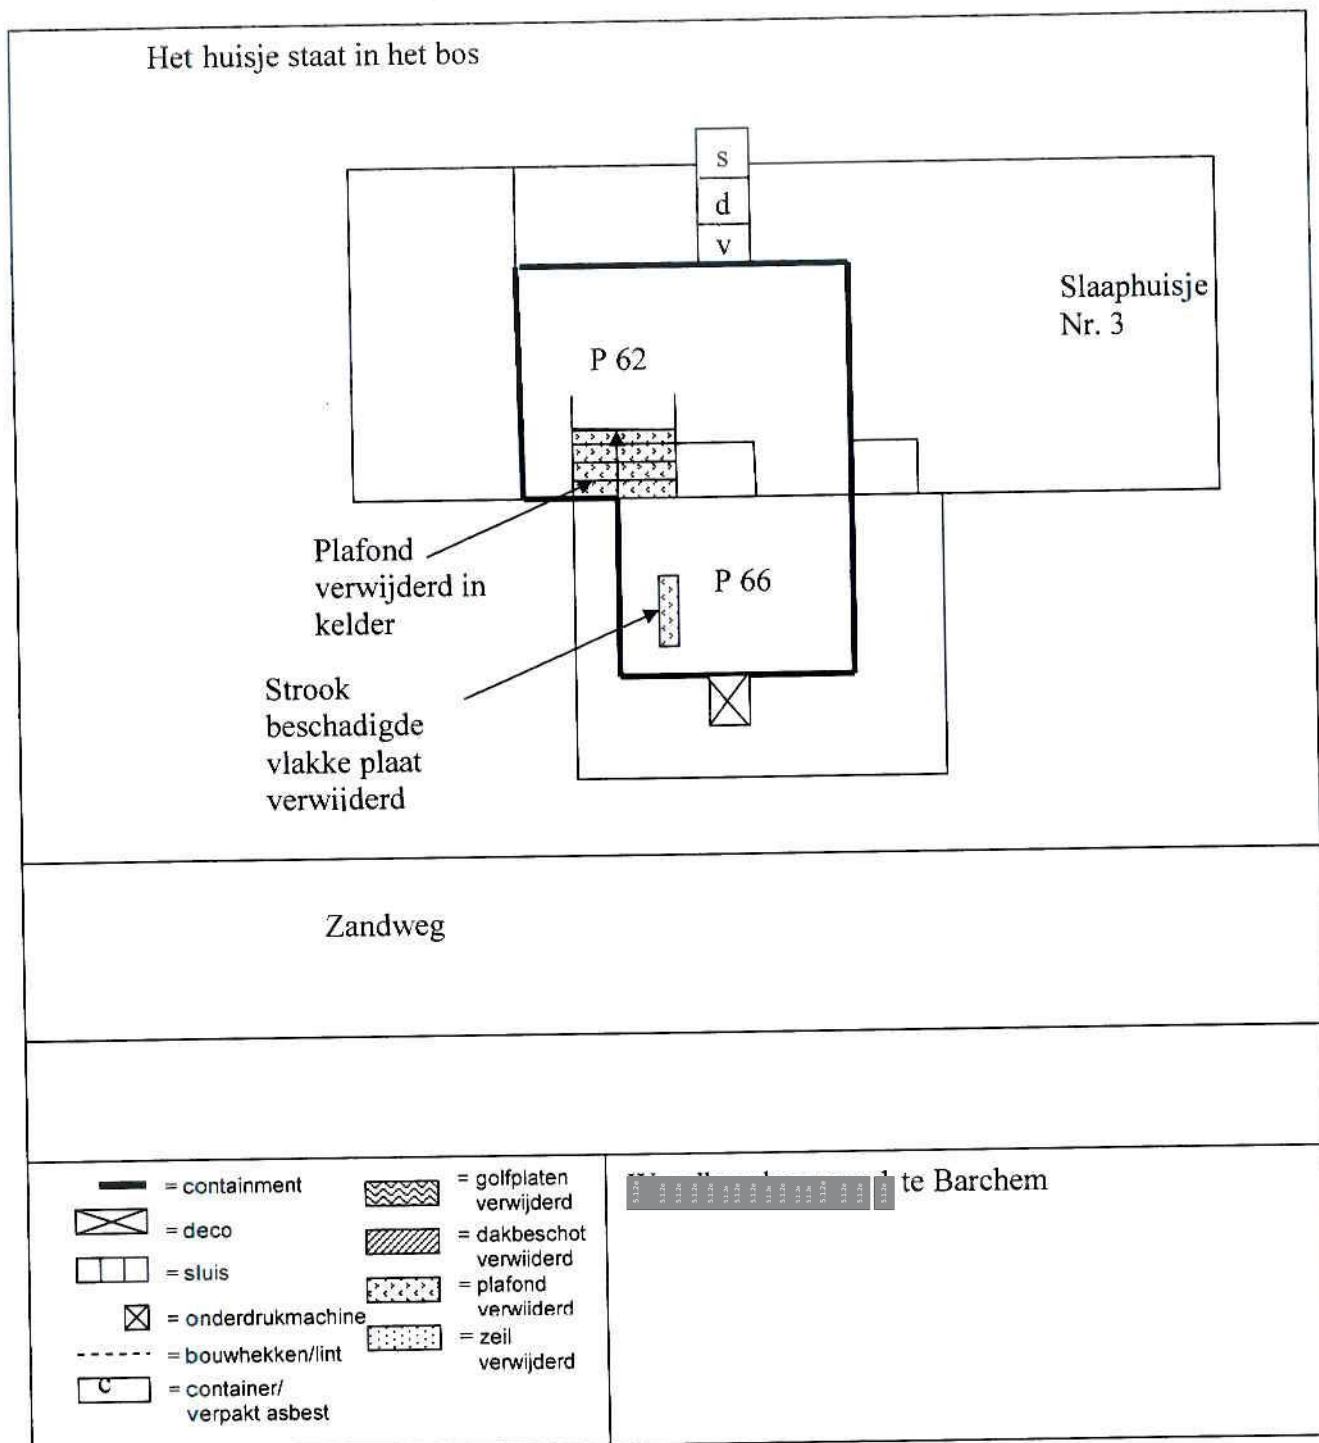

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR "TEST" LABORATORIA
ONDER NR. L376 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: 120200300

Opdrachtgever: Enzerink.
Contactpersoon: Dhr. R. Enzerink.
Projectnr.: 2012.023 Werkplannr.: 2012.023
Locatie adres: Woodbrookersweg 1 te Barchem.

Datum: 23-02-2012 Naam analist: 
Tijdsduur: Aankomst: 15.00 Vertrek: 17.30 Tijd op locatie: 2uur 30min
Werkzaamheden: Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie
Weer: Droog en bewolkt. T_{kalib} (°C): 10
P_{kalib} (hPa): 1026

Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)

Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudende vlakke plaat.

Locatie saneringswerkzaamheden: Ketelhuis in het hoofdgebouw op de begane grond.

Wat is er verwijderd: Ca 14m²

Asbestsoort (gew%): Chrysotiel 2-5%.

Hechtgebonden.

Inventarisatierapport ingezien: Ja Acmaa I11467.

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	X ja, 14m ²	O nee
Omgevingsvergunning aanwezig?	X ja	O nee
Voldoende verlichting?	X ja	O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja	X nee
Is de ruimte droog?	X ja	O nee
Is de ruimte stofvrij?	X ja	O nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	X ja	O nee
Zijn oppervlakken gefixeerd?	O ja	X nee
Sanering conform werkplan?	X ja	O nee
Opmerkingen: Deze vrijgave geldt alleen voor het verwijderde plafond in het ketelhuis. Flenspakkingen blijven zitten.		

Locatie/bouwdeel	Aanwezig	Resultaat
Plafond (constructiedelen)	X ja O nee	+
Kabelgoten doorvoeringen	O ja X nee	
Ventilatiekanalen	O ja X nee	
Buizen	X ja O nee	+
Verwarmingselementen	O ja X nee	
Kozijnen	X ja O nee	+
Plinten	O ja X nee	
Vloer	X ja O nee	+
Machines, installaties	X ja O nee	+
Overige, nl.	O ja X nee	
Opmerkingen: Naden en kieren voor zover mogelijk visueel geïnspecteerd. Ketel is aanwezig tijdens sanering deze is in zijn geheel in folie verpakt.		

* = direct in orde bevonden.
+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
ONDER NR. 1170 VOOR HET VOOR ZAKELIJK NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: 120200300

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters
Ketelhuis	+	+	+	--
Niet geïnspecteerde delen: Achter afgeplakte gedeelten.				

Conclusie visuele inspectie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied is geschikt voor de uitvoering van een luchtmeting.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -20 Pa	T _{aktueel} 18 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	37	50		
Tijd start meting	15.05	15.05		
Tijd stop meting	17.05	17.05		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8.3/8.3	8.3/8.3	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)	2	2		
Vezelconcentratie (v/cm ³)	0.001	0.001		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm ³)			0.000-0.002	

Opmerkingen:

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm³ lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

5.1.2e


5.1.2e

INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: 120200300

Globale situatietekening

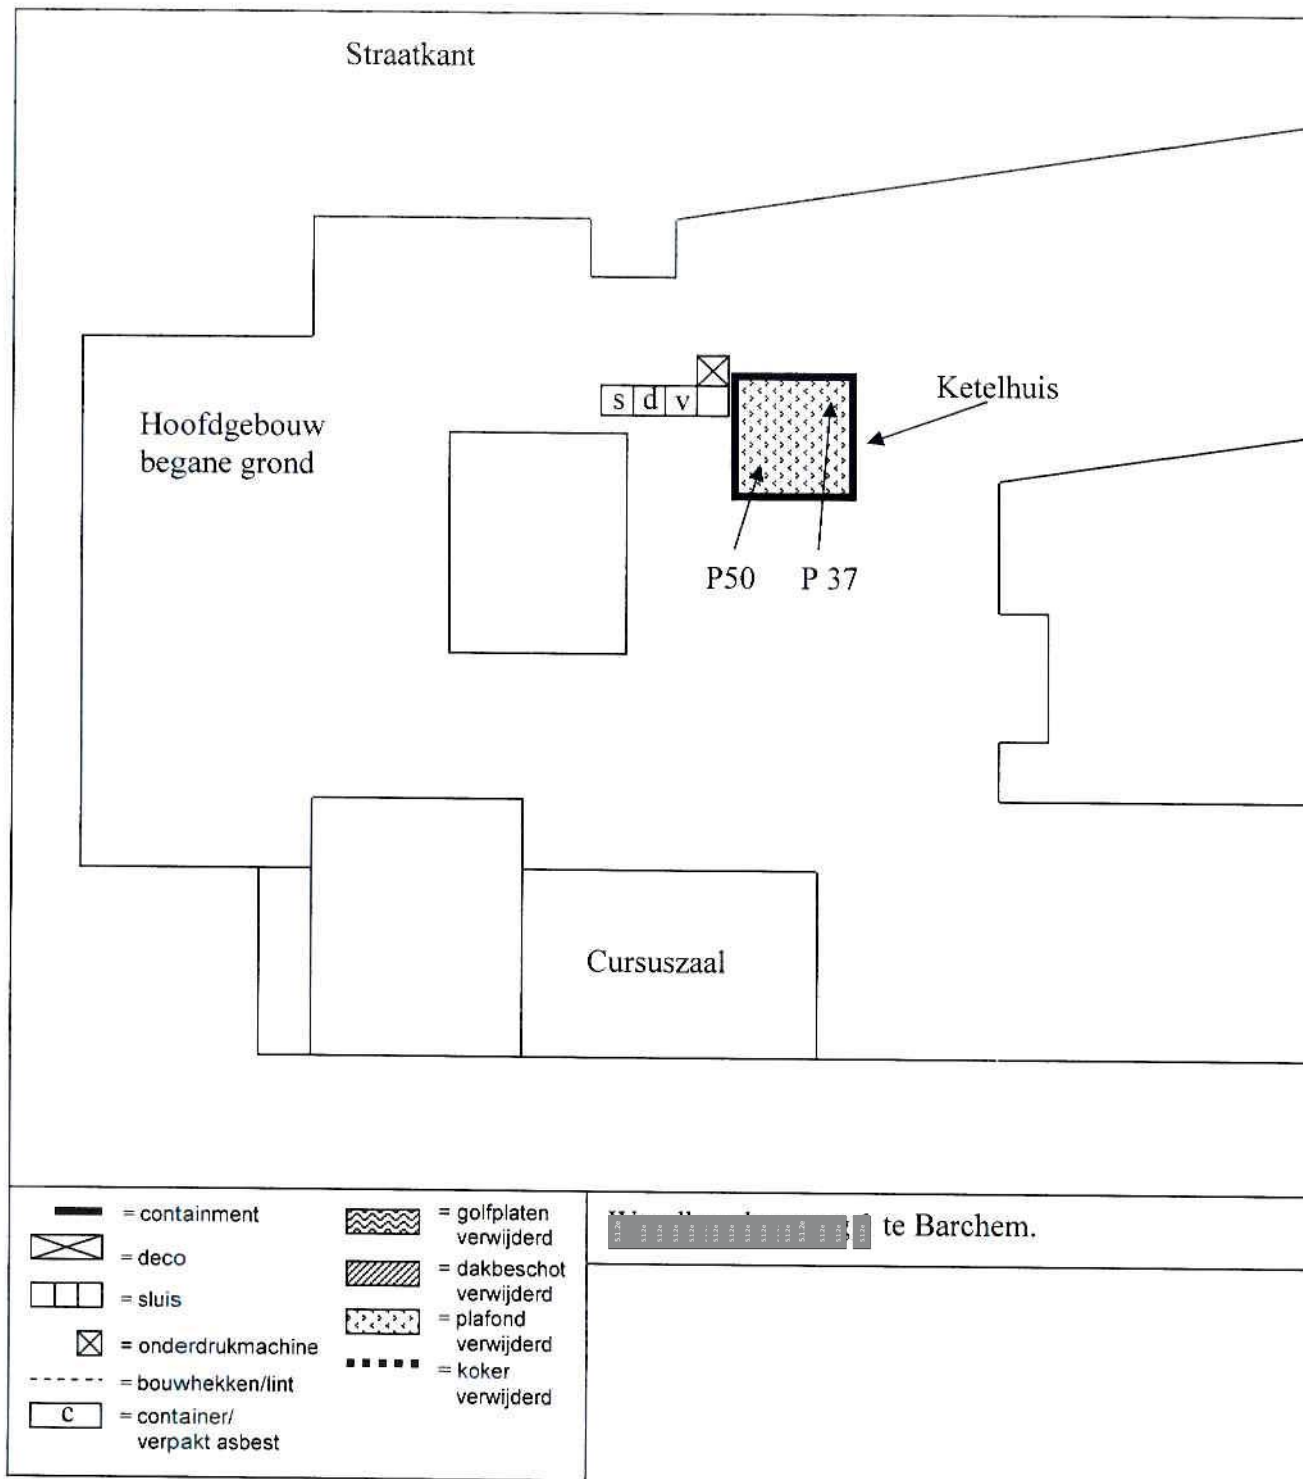

ACMAA ALMELO B.V. IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
ONDER NR. 1176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: 120200266

Opdrachtgever: Enzerink.
Contactpersoon: Dhr. R. Enzerink.
Projectnr. 2012.023 Werkplannr. 2012.023
Locatie adres: Woodbrookersweg 1 te Barchem.

Datum: 23-02-2012 Naam analist: [REDACTED]
Tijdsduur: Aankomst: 11.15 Vertrek: 13.45 Tijd op locatie: 2uur 30min
Werkzaamheden: Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie
Weer: Droog en bewolkt. T_{kalib} (°C): 10
P_{kalib} (hPa): 1026

Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)

Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudende vlakke plaat.

Locatie saneringswerkzaamheden: Ketelhuis in het hoofdgebouw op de begane grond.

Wat is er verwijderd: Ca 14m²

Asbestsoort (gew%): Chrysotiel 2-5%.

Hechtgebonden.

Inventarisatierapport ingezien: Ja Acmaa I11467.

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	X ja, 14m ² O nee
Omgevingsvergunning aanwezig?	X ja O nee
Voldoende verlichting?	X ja O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja X nee
Is de ruimte droog?	X ja O nee
Is de ruimte stofvrij?	X ja O nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	X ja O nee
Zijn oppervlakken gefixeerd?	O ja X nee
Sanering conform werkplan?	X ja O nee
Opmerkingen: Deze vrijgave geldt alleen voor het verwijderde plafond in het ketelhuis. Flenspakkingen blijven zitten.	

Locatie/bouwdeel	Aanwezig	Resultaat
Plafond (constructiedelen)	X ja O nee	+
Kabelgoten doorvoeringen	O ja X nee	
Ventilatiekanalen	O ja X nee	
Buizen	X ja O nee	+
Verwarmingselementen	O ja X nee	
Kozijnen	X ja O nee	+
Plinten	O ja X nee	
Vloer	X ja O nee	+
Machines, installaties	X ja O nee	+
Overige, nl.	O ja X nee	
Opmerkingen: Naden en kieren voor zover mogelijk visueel geïnspecteerd. Ketel is aanwezig tijdens sanering deze is in zijn geheel in folie verpakt.		

+ = direct in orde bevonden;
+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
ONDER NR. 176 VOOR GEBIEDEN 2012-2017. ADRES OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: 120200266

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleeft monsters
Ketelhuis	+	+	+	--
Niet geïnspecteerde delen: Achter afgeplakte gedeelten.				

Conclusie visuele inspectie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied is geschikt voor de uitvoering van een luchtmeting.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -20 Pa	T _{aktueel} 18 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pomppnummer	20	44		
Tijd start meting	11.20	11.20		
Tijd stop meting	13.20	13.20		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8.3/8.3	8.3/8.3	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)				
Vezelconcentratie (v/cm³)				
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm³)				-

Opmerkingen: De filters waren compleet dichtgeslagen door stof en daardoor niet te tellen.

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval NIET te bepalen is. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie NIET worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

5.1.2e


INSPECTIE
RvAT 119

INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: 120200266

Globale situatietekening

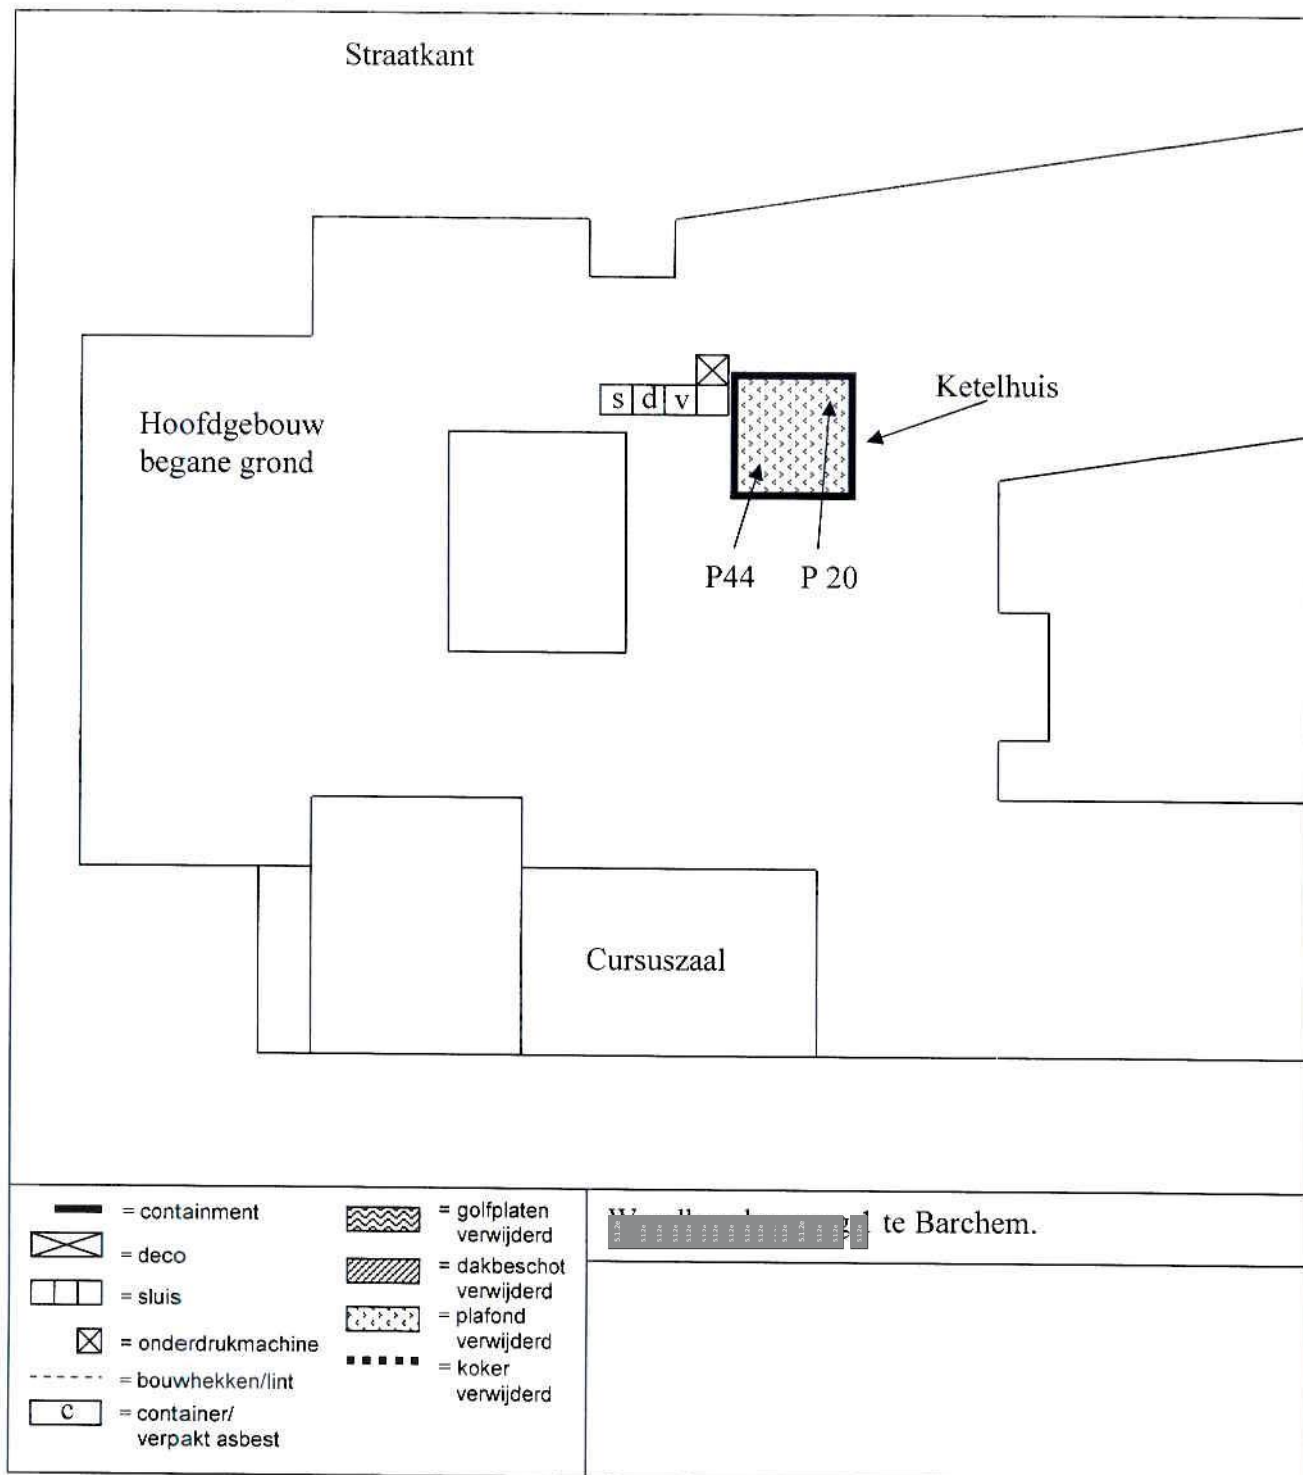

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
ONDER NR. 1 176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200193

Opdrachtgever: Enzerink
Contactpersoon: Dhr. R. Enzerink
Projectnr.: 2012.023 Werkplannr.: 2012.023
Locatie adres: Woodbrookerweg 1 te Barchem

Datum: 11-06-2012 Naam analist: 11-06-2012
Tijdsduur: Aankomst 15.00 Vertrek 18.00 Tijd op locatie: 3 uur
Werkzaamheden: Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie
Weer: Zonnig T_{kalib} (°C): 11
P_{kalib} (hPa): 1030

VISUELE INSPECTIE (conform NEN 2990:2005)

Inventarisatierapport ingezien en zijn alle te verwijderen materialen goed beschreven: Ja Acmaa I11467

Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudende ac-buis.

Locatie saneringswerkzaamheden: Subruimte 1ste verdieping (vloer en wand)

Wat is er verwijderd: 0,5m¹ buis.

Asbestsoort (gew%): Chrysotiel 15-30%

Hechtgebonden.

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	X ja, 1m ²	O nee
Is er een sloopvergunning aanwezig?	X ja	O nee
Voldoende belichting?	X ja	O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja	X nee
Is de ruimte droog?	X ja	O nee
Is de ruimte stofvrij?	X ja	O nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	O ja	X nee
Zijn oppervlakten gefixeerd?	O ja	X nee
Sanering conform werkplan?	X ja	O nee
Opmerkingen:		

Locatie/bouwdeel	Aanwezig		Resultaat
Ontl.buis (constructiedelen)	X ja	O nee	+
Kabelgoten doorvoering	O ja	X nee	
Ventilatiekanalen	O ja	X nee	
Buizen	O ja	X nee	
Verwarmingselementen	O ja	X nee	
Kozijnen	O ja	X nee	
Plinten	O ja	X nee	
Vloer/wand	X ja	O nee	+
Machines, installaties	O ja	X nee	
Overige, nl.	O ja	X nee	
Opmerkingen:			
+ = direct in orde bevonden;			
+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;			
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen			



INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200193

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleeftmonsters
Ontluchtingsbuis	+	+	+	--

Niet geïnspecteerde delen:

CONCLUSIE VISUELE INSPECTIE

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voorzover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolgwerkzaamheden en/of vrijgavemetingen.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -22 Pa	T _{aktueel} 18°C	bl 0	HSE/NPL 5	D 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	20	21		
Tijd start meting	15.15	15.15		
Tijd stop meting	17.15	17.15		
Monsternameduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8,3/8,2	8,3/8,3	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)	5	3		
Vezelconcentratie (v/cm ³)	0,002	0,001		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm ³)				0,000-0,004

Opmerkingen:

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm³ lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

5.1.2e



5.1.2e

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN.
ONDER NR. 1176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE.

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200193a

Opdrachtgever: Enzerink
Contactpersoon: Dhr. R. Enzerink
Projectnr.: 2012.023 Werkplannr.: 2012.023
Locatie adres: Woodbrookerweg 1 te Barchem

Datum: 11-08-2012 Naam analist: J. van der Vliet
Tijdsduur: Aankomst 15.00 Vertrek 18.00 Tijd op locatie 3 uur
Werkzaamheden: Visuele inspectie na asbestsanering Binnensituatie
Weer: Zonnig T_{kalib} (°C) 11
P_{kalib} (hPa) 1030

VISUELE INSPECTIE (conform NEN 2990:2005)

Inventarisatierapport ingezien en zijn alle te verwijderen materialen goed beschreven: Ja Acmaa I11467

Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudende vlakke plaat.

Locatie saneringswerkzaamheden: Platte dak rechts naast hoofdingang.

Wat is er verwijderd: 0,6m² vlakke plaat.

Asbestsoort (gew%): Chrysotiel 10-15%

Hechtgebonden.

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	O ja, m ²	X nee
Is er een sloopvergunning aanwezig?	X ja	O nee
Voldoende belichting?	X ja	O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja	X nee
Is de ruimte droog?	X ja	O nee
Is de ruimte stofvrij?	O ja	X nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	O ja	X nee
Zijn oppervlakten gefixeerd?	O ja	X nee
Sanering conform werkplan?	X ja	O nee
Opmerkingen:		

Locatie/bouwdeel	Aanwezig		Resultaat
gevelplaat (constructiedelen)	X ja	O nee	+
Kabelgoten doorvoering	O ja	X nee	
Ventilatiekanalen	O ja	X nee	
Buizen	O ja	X nee	
Verwarmingselementen	O ja	X nee	
Kozijsen	O ja	X nee	
Plinten	O ja	X nee	
Vloer/plat dak	X ja	O nee	+
Machines, installaties	O ja	X nee	
Overige, nl.	O ja	X nee	
Opmerkingen:			

+ = direct in orde bevonden.

+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;

A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200193a

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleefmonsters
Gevelplaat	+	+	+	--
Niet geïnspecteerde delen:				

CONCLUSIE VISUELE INSPECTIE

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voorzover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied kan worden vrijgegeven voor vervolwerkzaamheden en/of vrijgavemetingen.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA'er opdrachtgever

5.1.2e

5.1.2e




HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
ONDER NR. 1176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200193a

Globale situatietekening

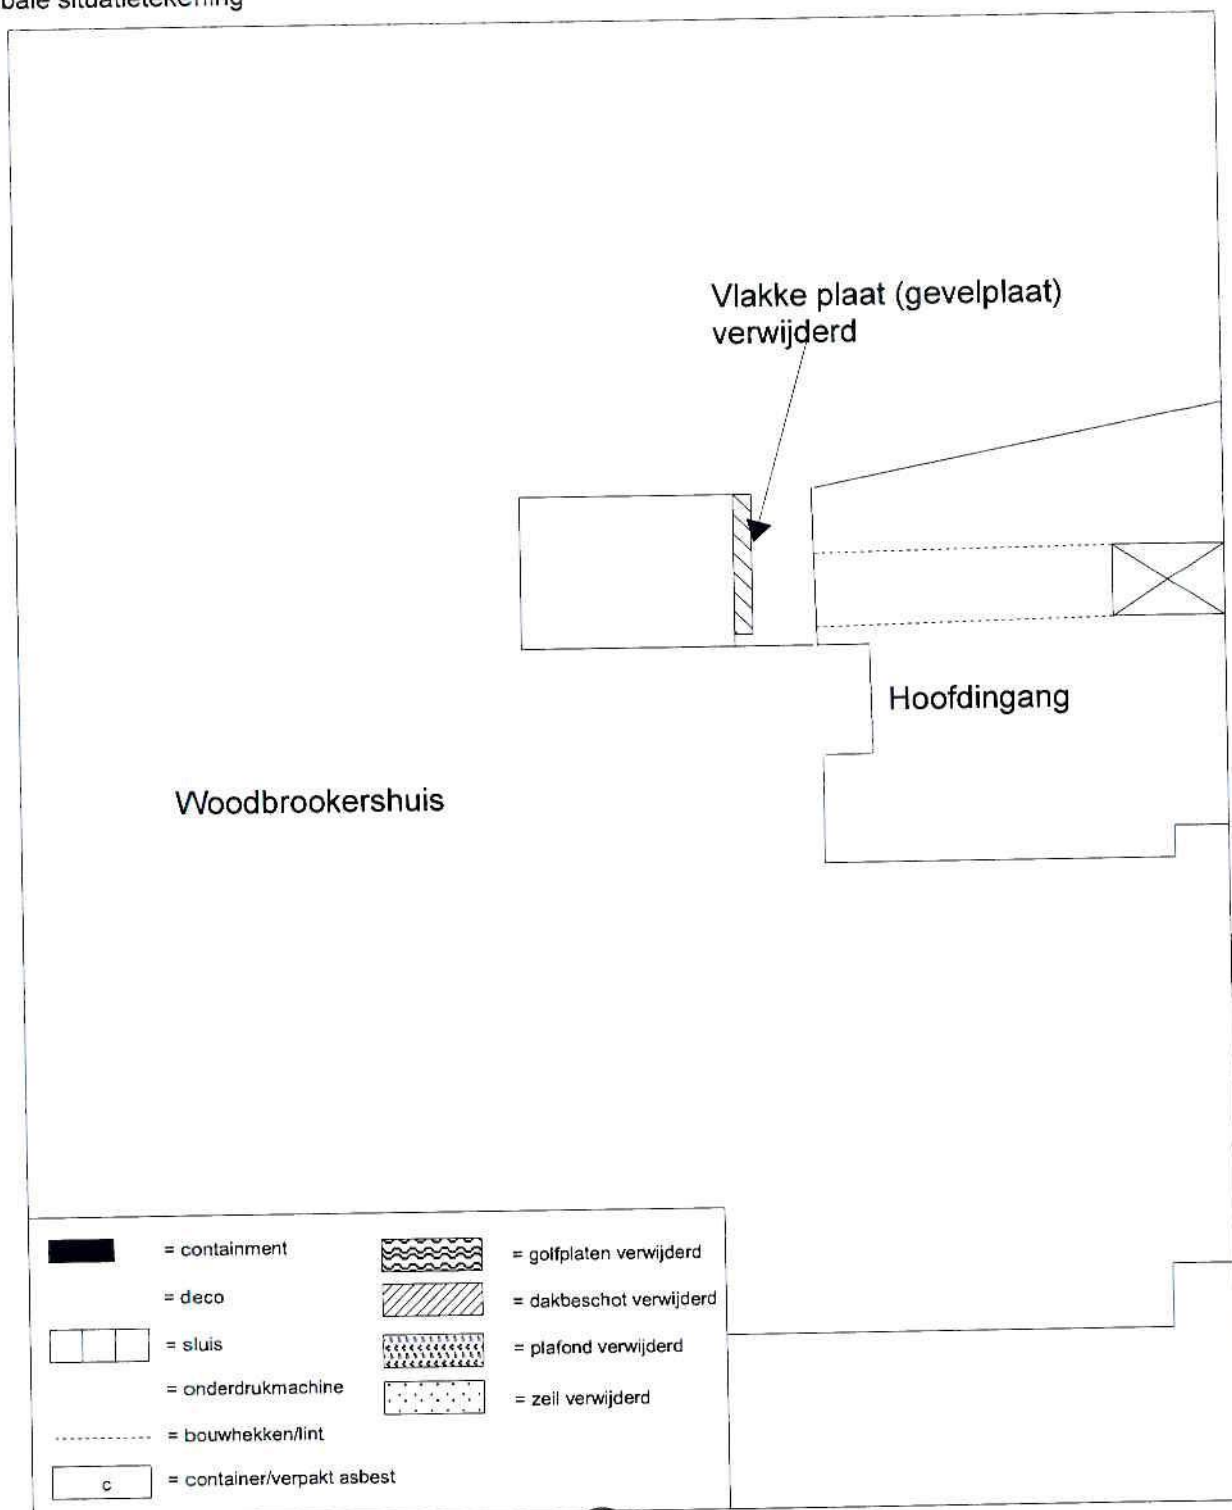

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
ONDER NR. 1176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200098

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleeft monsters
Vloer kast cursuszaal	+	+	+	--
Niet geïnspecteerde delen:				

Conclusie visuele inspectie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voorzover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied is geschikt voor de uitvoering van een luchtmeting.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -25 Pa	T _{aktueel} 15 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pomppnummer	42	52		
Tijd start meting	12:10	12:10		
Tijd stop meting	14:10	14:10		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8,2/8,2	8,2/8,2	/	/
Monstervolume (l)	984	984		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)	2	2		
Vezelconcentratie (v/cm ³)	0.001	0.001		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm ³)			0.000-0.002	

Opmerkingen:

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm³ lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e




INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Globale situatietekening

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200098

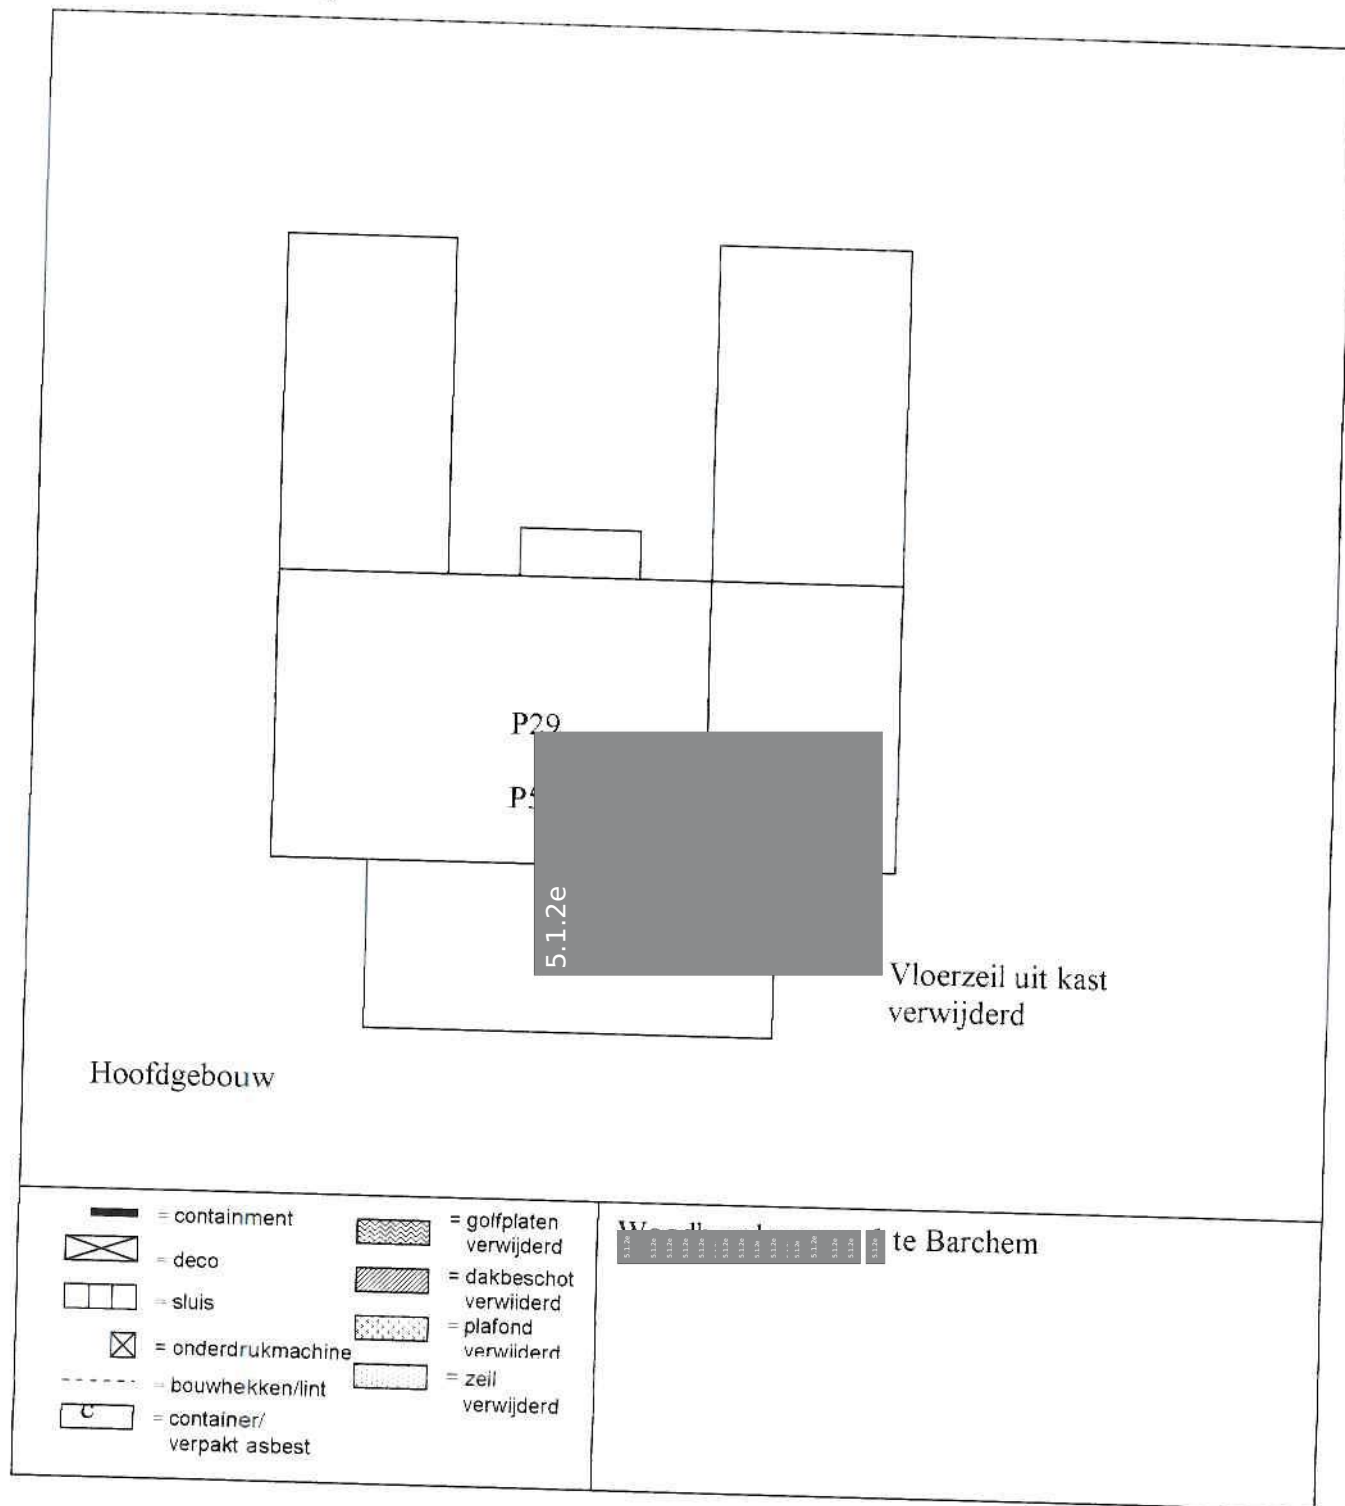

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
ONDER NR. 1176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200098a

Opdrachtgever Enzerink
Contactpersoon Dhr. R. Enzerink
Projectnr. 2012.023
Locatie adres Woodbrookersweg 1 te Barchem

Werkplannr. 2012.023

Datum 16-02-2012 Naam analist 
Tijdsduur Aankomst 12:00 Vertrek 15:30 Tijd op locatie 3 uur 30min
Werkzaamheden Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie
Weer Bewolkt en droog T_{kalib} (°C) 15
P_{kalib} (hPa) 1022

Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)

Inventarisatierapport ingezien en zijn alle te verwijderen materialen goed beschreven: Ja, Acmaa I11467.

Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudend vloerzeil(M4).

Locatie saneringswerkzaamheden: Telefooncel begane grond.

Wat is er verwijderd: Ca. 1m² vloerzeil

Asbestsoort (gew%): Chrysotiel 30-60%

Niet hechtgebonden.

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	X ja, 3m ²	O nee
Is er een omgevingsvergunning aanwezig	X ja	O nee
Voldoende verlichting?	X ja	O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja	X nee
Is de ruimte droog?	X ja	O nee
Is de ruimte stofvrij?	X ja	O nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	O ja	X nee
Zijn oppervlakken gefixeerd?	O ja	X nee
Werkplan in overeenstemming met te inspecteren object	X ja	O nee
Opmerkingen:		

Locatie/bouwdeel	Aanwezig	Resultaat
Plafond (constructiedelen)	X ja O nee	+
Kabelgoten doorvoeringen	O ja x nee	
Ventilatiekanalen	O ja x nee	
Buizen	O ja x nee	
Verwarmingselementen	O ja x nee	
Kozijnen	O ja x nee	
Plinten	X ja O nee	+
Vloer	X ja O nee	+
Machines, installaties	O ja x nee	
Overige, nl.	O ja x nee	
Opmerkingen:		

+ = direct in orde bevonden
+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200098a

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegende delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleeft monsters
Vloer telefooncel begane grond	+	+	+	--
Niet geïnspecteerde delen:				

Conclusie visuele inspectie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voorzover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied is geschikt voor de uitvoering van een luchtmeting.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -20 Pa	T _{aktueel} 15 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	5	34		
Tijd start meting	12:25	12:25		
Tijd stop meting	14:25	14:25		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8,2/8,2	8,2/8,2	/	/
Monstervolume (l)	984	984		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)	1	4		
Vezelconcentratie (v/cm ³)	0.000	0.002		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm ³)			0.000-0.003	

Opmerkingen:

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm³ lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever




INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120200098a

Globale situatietekening

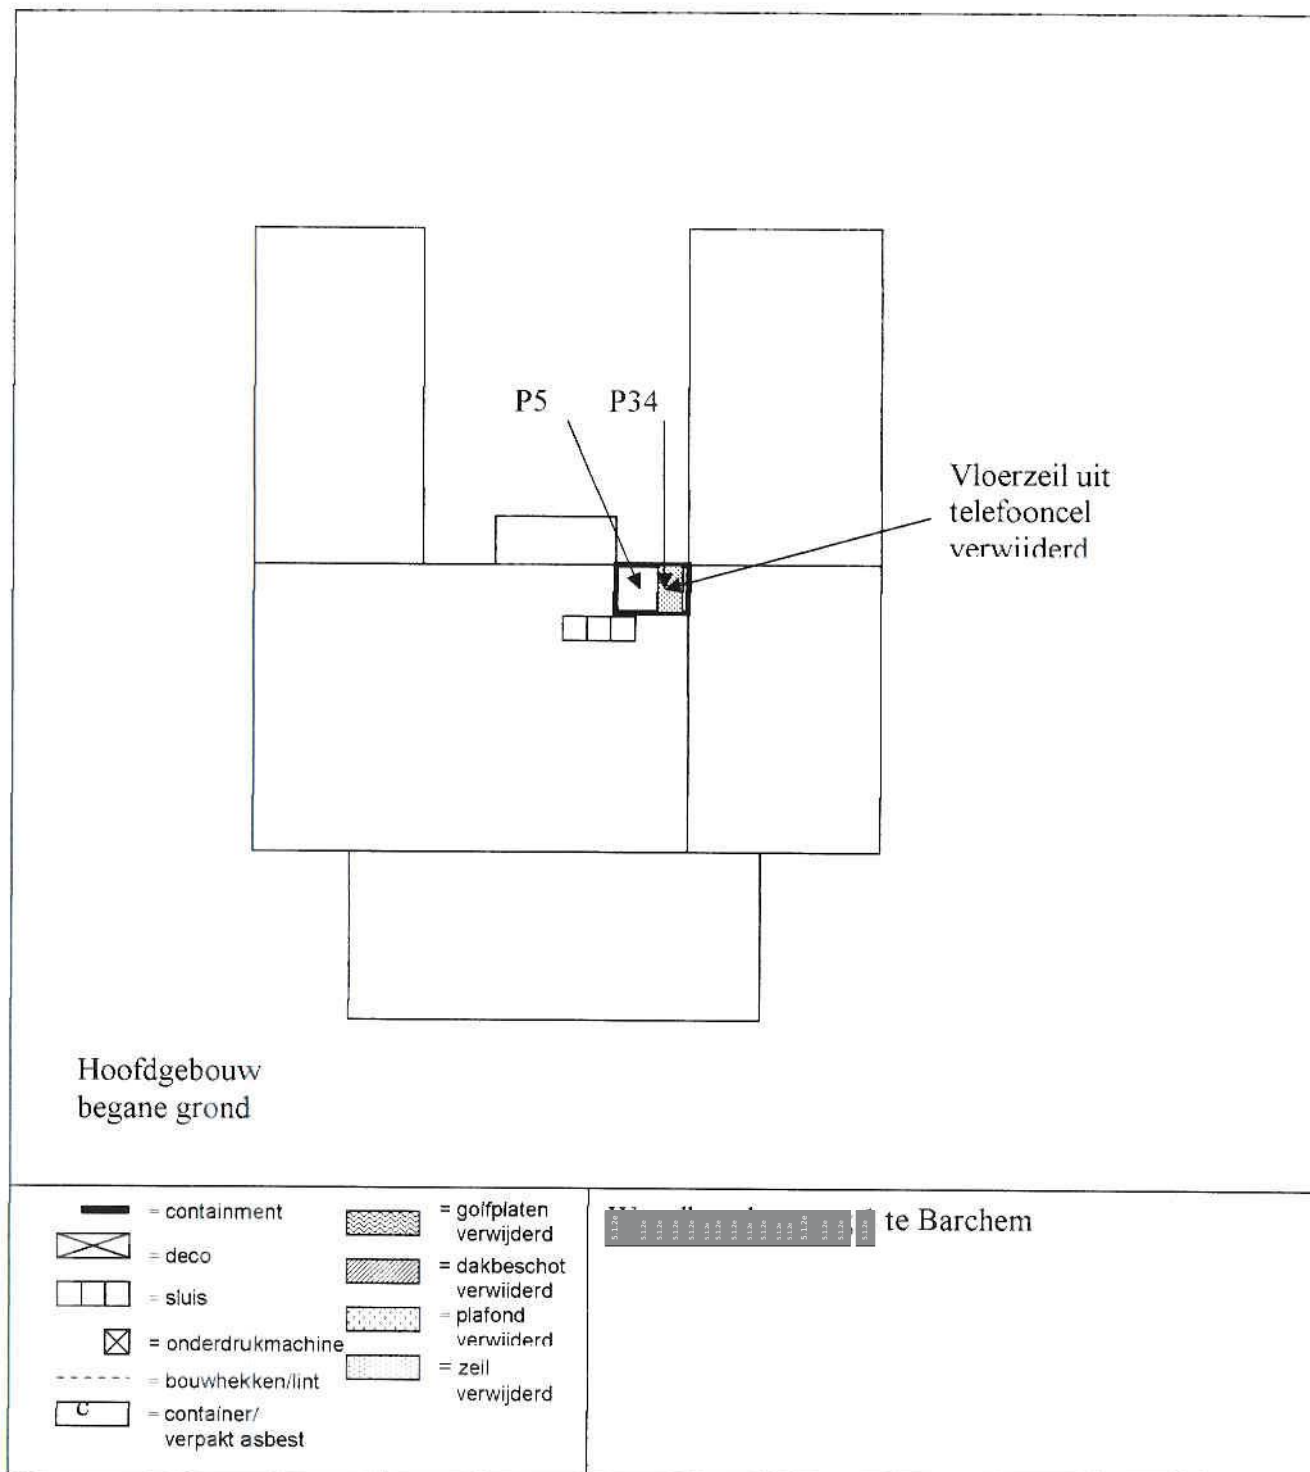

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
ONDER NR. 1176 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door
afzender (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht
afzender (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden
daartoe bevoegde personen. De donker gearceerde velden

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **Enzerink B.V.**
straat + nr **Varsselseweg 49**
postc. + woonpl. **7255 NR Hengelo Gld.**
VIHB-nummer **GL503388VIXX**

2
factuuradres **Enzerink B.V.**
postbus of straat + nr **Varsselseweg 49**
postc. + woonpl. **7255 NR Hengelo Gld.**

3
ontdoener
straat + nr **Woud Brakke Weg 1**
postc. + woonpl. **Lochem**

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

3
locatie van herkomst
straat + nr **Woud Brakke Weg 1**
postc. + woonpl. **Lochem**
datum aanvang transport **15.02.2012**

4
locatie van bestemming
straat + nr **Zier**
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer **GL503388VIXX**
kenteken
route-inzameling ☐ ja ☐ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☐ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
	AS Best Houder A Puul - 25 170605				

Opertuissnr. 15-02-12 16:07
000051 B 03000kg
T 02740kgPT
N 00260kg

Klant
Produkt
Order



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te
Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over
de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

5.1.2e

handtekening ontvanger

5.1.2e

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

5.1.2e

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief



AB01043986

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender 2 ☒ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **Enzerink BV**
straat + nr. **Varsselseweg 49**
postc. + woonpl. **7255 NR Hengelo Gld.**
VIHB-nummer **GL503388VIXX**

2
factuuradres
postbus of straat + nr.
postc. + woonpl.

3
ontvanger
straat + nr.
postc. + woonpl.

4
uitbesteed vervoerder
straat + nr.
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☒ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr.
postc. + woonpl.
VIHB-nummer **GL053388VIXX**
kenteken

6
afvalstroomnummer **05WM1AS** gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **asbest**
aantal/
verpakking **170605*** eural code **A01**
verw. meth. **A01** geschatte hoeveelheid (kg)



3
locatie van herkomst **2012-023**
straat + nr. **Woodbrookseweg**
postc. + woonpl. **Barchem**
datum aanvang transport **22.03.2012**

4
locatie van bestemming **BV**
straat + nr. **Hengelo Gld.**
datum ontvangst transport

Utoetuingr. 22.03.12 15:59
000051 B 02720kg
T 02680kgPT
N 00040kg

Klant
Produkt
Order

AB21688832

Auteursrecht:
s.v.a. / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door s.v.a. / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.g.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

Handtekening ontvanger
Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijktijdig genummerde vrachtbiljet

Handtekening ontvanger (geabonneerde) voor goede ontvangst der zending met gelijktijdig genummerde vrachtbiljet

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender 2 ☒ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **Enzerink BV**
straat + nr. **Varsselseweg 49**
postc. + woonpl. **7255 NR Hengelo Gld.**
VIHB-nummer **GL503388VIXX**

2
factuuradres
postbus of straat + nr.
postc. + woonpl.

3*
ontvanger **Zie 1**
straat + nr.
postc. + woonpl.

4*
uitbesteed vervoerder **Zie 1**
straat + nr.
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☒ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☒ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **Zie 1**
straat + nr.
postc. + woonpl.

6



3* **Project NR 2012.023**
locatie van herkomst **Woodbroekersweg 7**
straat + nr.
postc. + woonpl. **Barchem**
datum aanvang transport **22-2-2012**
4*
locatie van bestemming **BV**
straat + nr.
postc. + woonpl. **Hengelo Gld.**
datum ontvangst transport

afvalstroomnummer **05WM1AS** gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **asbest**

aantal/
verpakking **170605*** eural
code **A01** geschatte
verw. hoeveelheid
meth. (kg)

Voertuignr. **22.02.12 16:21**
000111 B 02880 kg
T 02480 kg FT
N 00400 kg

Klant
Produkt
Onder

AB21688844

5.1.2e	Handtekening afzender	Handtekening ontvanger	Handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbijl.	Handtekening ontvanger (geadresseerd) voor goede ontvangst der zending met gelijkenummerde vrachtbijl.
---------------	------------------------------	-------------------------------	---	---

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☒ 2 ontvanger ☐ 3 handelaar ☐ 4 bemiddelaar
afzender **Enzerink BV**
straat + nr **Varsselseweg 49**
postc. + woonpl. **7255 NR Hengelo Gld.**
VIHB-nummer **GL503388VIXX**

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3^a
ontdoener **St. Beheer Woodbroekershuis**
straat + nr **Dochterenseweg 4**
postc. + woonpl. **7245 NM Barchem**

4^a
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: ☐ 1 afzender ☐ 2 ontvanger ☒ 3 ontvanger ☐ 4 inzamelaar ☐ 5 vervoerder ☐ 6 uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer **GL503388VDDX**
kenteken

6
afvalstroomnummer **05WM1AS 1 20 23** gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **asbest**
aantal/
verpakking **170805*** eural code **A01**
verw. meth. **A01** geschatte hoeveelheid (kg)



3^b
locatie van herkomst
straat + nr **Varsselseweg 1**
postc. + woonpl. **7244 RB Barchem**
datum aanvang transport

4^b
locatie van bestemming **BV**
straat + nr
postc. + woonpl. **Hengelo Gld.**
datum ontvangst transport

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☐ nee
zie toelichting

Uoertuigenr. 28.03.12 13:19
000333 B 01440kg
T 01320kgPT
N 00120kg

Klant
Produkt
Order



AB21688594

5.1.2e handtekening afzender	5.1.2e handtekening ontvanger	5.1.2e er	5.1.2e voor
---------------------------------	----------------------------------	--------------	----------------

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	24, 26
