

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 2

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300007c

Opdrachtgever 5.1.2e
Contactpersoon 5.1.2e
Projectnr. 2012.023 Werkplannr. 2012.23
Locatie adres 5.1.2e te Barchem.

Datum 07-03-2012 Naam analist 5.1.2e
Tijdsduur Aankomst 16.00 Vertrek 18.00 Tijd op locatie 3uur
Werkzaamheden Omgevingsluchtmeting na asbestsanering Binnensituatie
Weer Bewolkt en regen. T_{kalib} (°C) 9
 P_{kalib} (hPa) 1018

LUCHTMETING

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -- Pa	T _{aktueel} 11 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	53	41		
Tijd start meting	16.28	16.28		
Tijd stop meting	18.28	18.28		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8.3/8.3	8.3/8.3	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100	100	
Aantal getelde vezels (v)	0	1		
Vezelconcentratie (v/ml)	0.000	0.000		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/ml)			0.000-0.001	

Opmerkingen: Het betreft een achtergrondmeting bij de sluis van een klasse 3 sanering.

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de omgevingslucht van de aangrenzende ruimte van de asbestsanering, op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval, NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/ml lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

5 5.1.2e


5.1.2e

INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 2

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300007c

Globale situatietekening

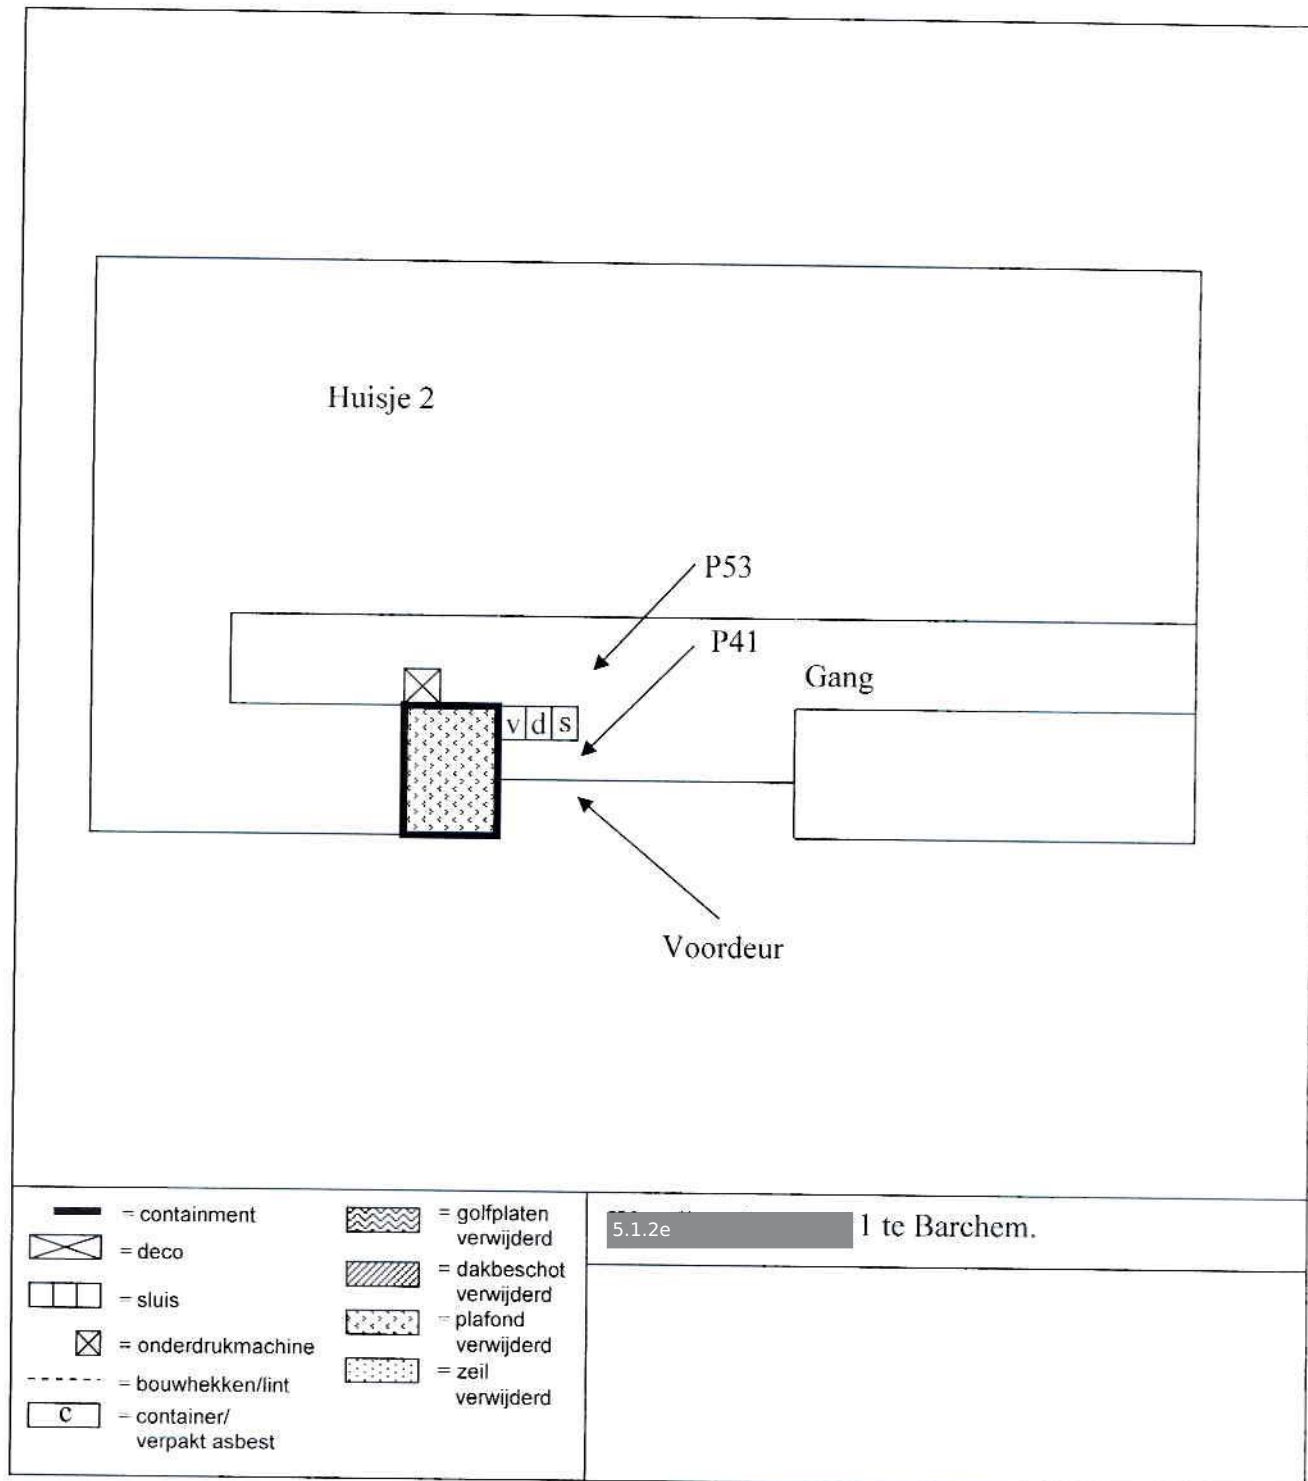

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 2

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300007a

Opdrachtgever 5.1.2e
Contactpersoon 5.1.2e
Projectnr. 2012.023 Werkplannr. 2012.23
Locatie adres 5.1.2e te Barchem.

Datum 07-03-2012 Naam analist 5.1.2e
Tijdsduur Aankomst 16.00 Vertrek 18.00 Tijd op locatie 3uur
Werkzaamheden Omgevingsluchtmeting na asbestsanering Binnensituatie
Weer Bewolkt en regen. T_{kalib} (°C) 9
P_{kalib} (hPa) 1018

LUCHTMETING

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -- Pa	T _{aktueel} 11 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	56	37		
Tijd start meting	16.03	16.03		
Tijd stop meting	18.03	18.03		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8.3/8.3	8.3/8.3	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100	100	
Aantal getelde vezels (v)	1	0		
Vezelconcentratie (v/ml)	0.000	0.000		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/ml)			0.000-0.001	

Opmerkingen: Het betreft een achtergrondmeting bij de sluis van een klasse 3 sanering.

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de omgevingslucht van de aangrenzende ruimte van de asbestsanering, op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval, NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/ml lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

5.1.2e
5.1.2e

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever


5.1.2e
5.1.2e

INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 2

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300007a

Globale situatietekening

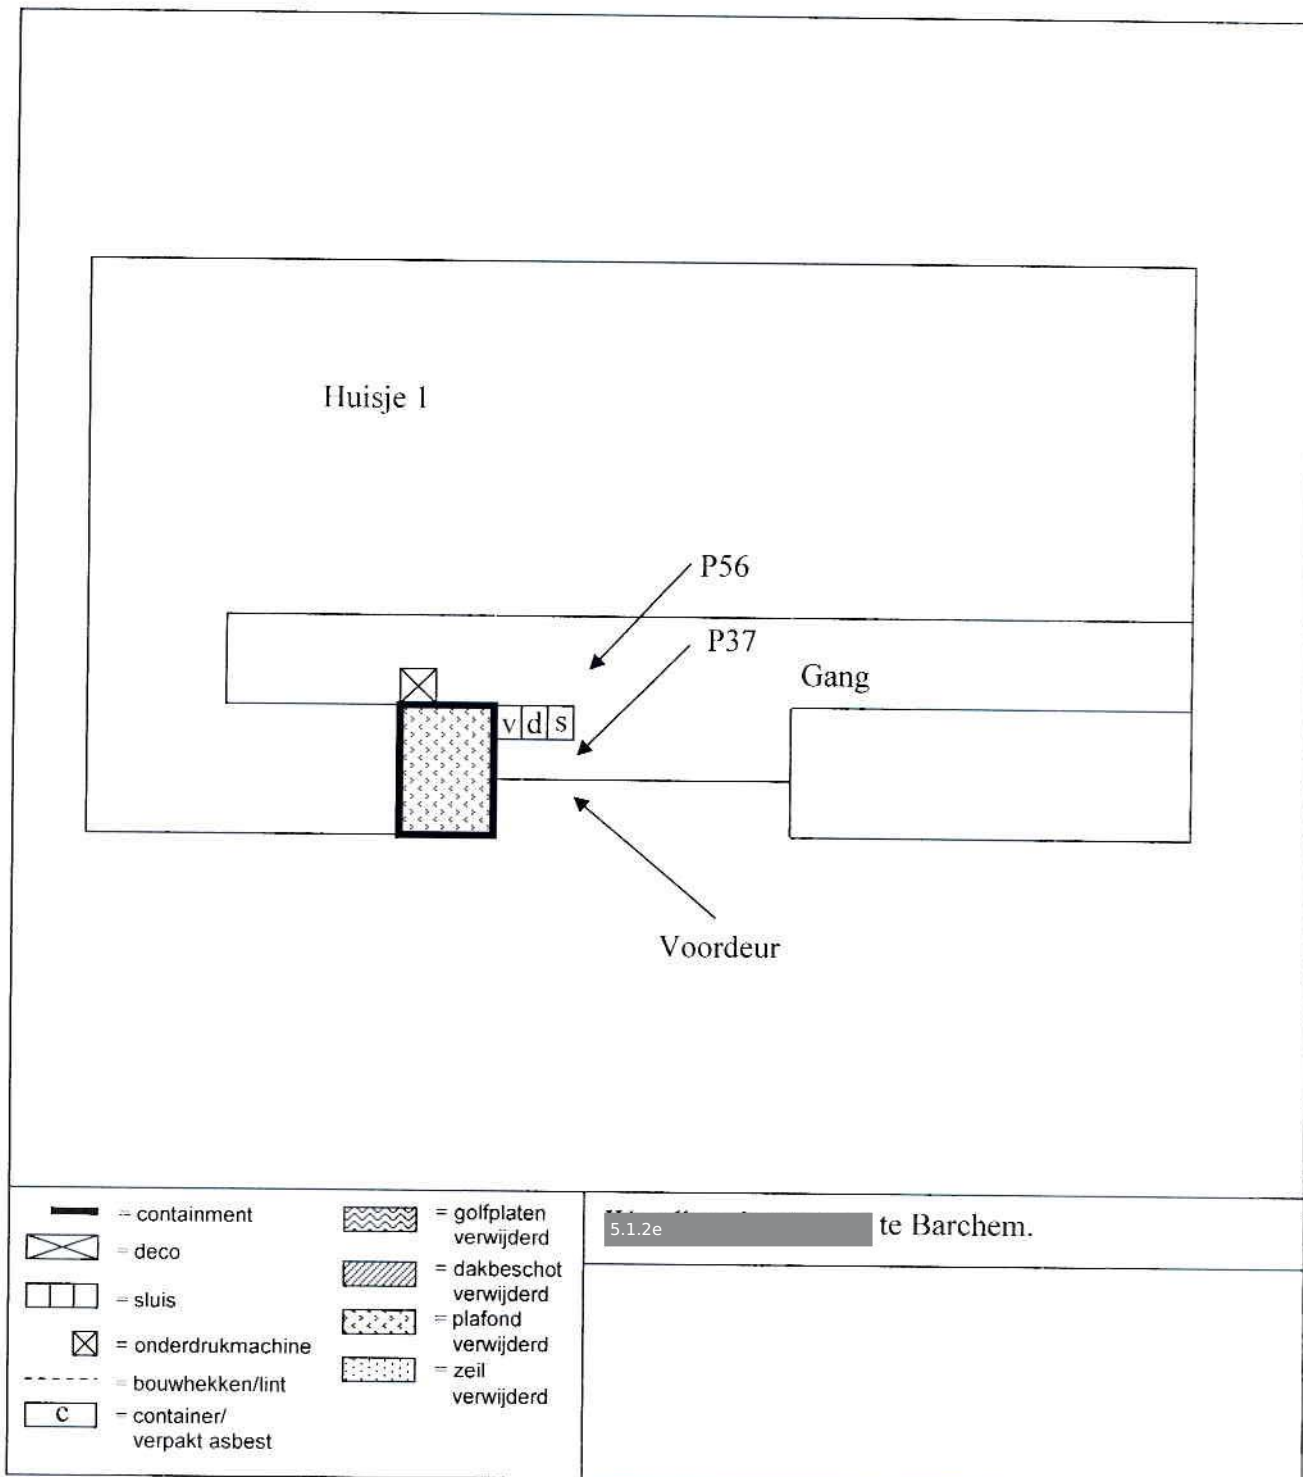

INSPECTIERAPPORT

Pagina 1 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300007b

Opdrachtgever: 5.1.2e
Contactpersoon: 5.1.2e
Projectnr. 2012.023 Werkplannr. 2012.023
Locatie adres: 5.1.2e te Barchem.

Datum: 07-03-2012 Naam analist: 5.1.2e
Tijdsduur: Aankomst: 16.00 Vertrek: 19.00 Tijd op locatie: 3uur
Werkzaamheden: Lucht-eindcontrole containment na asbestsanering Binnensituatie
Weer: Bewolkt en regen. T_{kalib} (°C): 8
P_{kalib} (hPa): 1018

Visuele inspectie (conform NEN 2990:2005)

Omschrijving saneringswerkzaamheden: Verwijderen van asbesthoudende vlakke plaat.

Locatie saneringswerkzaamheden: In het cv hok van huisje 2.

Wat is er verwijderd: Ca 2m²

Asbestsoort (gew%): Chrysotiel 2-5% en amosiet 30-60%

Niet Hechtgebonden.

Inventarisatierapport ingezien: Ja Acmaa I11467.

Voor de globale situatietekening wordt verwezen naar de laatste pagina van het inspectierapport.

Containment aanwezig?	X ja	3m ² O nee
Omgevingsvergunning aanwezig?	X ja	O nee
Voldoende verlichting?	X ja	O nee
Verpakt afval of losse obstakels aanwezig?	O ja	X nee
Is de ruimte droog?	X ja	O nee
Is de ruimte stofvrij?	X ja	O nee
Is te verwijderen asbesthoudend materiaal aanwezig?	O ja	X nee
Zijn oppervlakken gefixeerd?	O ja	X nee
Sanering conform werkplan?	X ja	O nee
Opmerkingen: Deze vrijgave geldt alleen voor het verwijderde plafondplaatje in de cv ruimte van huisje 2.		

Locatie/bouwdeel	Aanwezig	Resultaat
Plafond (constructiedelen)	X ja O nee	+
Kabelgoten doorvoeringen	O ja X nee	
Ventilatiekanalen	O ja X nee	
Buizen	O ja X nee	
Verwarmingselementen	O ja X nee	
Kozijnen	O ja X nee	
Plinten	O ja X nee	
Vloer	X ja O nee	+
Machines, installaties	O ja X nee	
Overige, nl.	O ja X nee	
Opmerkingen: Naden en kieren tot visuele diepte geïnspecteerd.		

+ = direct in orde bevonden;
+ (2) = in orde na één aanvullende schoonmaak;
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestresten; gehele ruimte reinigen



INSPECTIERAPPORT

Pagina 2 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300007b

Locatie/bouwdeel	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerkingen en codering genomen kleeftmonsters
Huisje 2	+	+	+	---

Niet geïnspecteerde delen: Achter afgeplakte gedeelten.

Conclusie visuele inspectie

Bij de uitgevoerde visuele inspectie zijn geen asbestverdachte- en/of asbestbesmette materialen aangetroffen, voor zover deze onderdeel vormen van de sanering. Het saneringsgebied is geschikt voor de uitvoering van een luchtmeting.

LUCHTMETING (conform NEN 2990:2005)

Plaatsing van de pompen aangeven in de globale situatietekening.

P _{aktueel} -24 Pa	T _{aktueel} 11 °C	bl 0	HSE/NPL 5	d 99,7 µm
Monsternummer	1	2		
Pompnummer	46	50		
Tijd start meting	16.30	16.30		
Tijd stop meting	18.30	18.30		
Monsterduur (min)	120	120		
Debiet begin/eind (l/min)	8.3/8.3	8.3/8.3	/	/
Monstervolume (l)	996	996		
Homogene belading	X ja O nee	X ja O nee	O ja O nee	O ja O nee
Aantal getelde velden	100	100		
Aantal getelde vezels (v)	1	1		
Vezelconcentratie (v/cm³)	0.000	0.000		
Onder- en bovengrens vlgs. 95% betrouwbaarheidsinterval (v/cm³)			0.000-0.002	

Opmerkingen:

CONCLUSIE

Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde asbestiforme vezelconcentratie in de ruimte op het moment van de luchtmeting met een bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval NIET de wettelijke norm van 0,01 vezels/cm³ lucht overschrijdt. In het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan de (sanerings) locatie worden vrijgegeven.

Naam en handtekening analist ACMAA Almelo

Naam en handtekening DTA-er opdrachtgever

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e




HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLINGEN
ONDER NR. 5.1.2e VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDITATIE

INSPECTIERAPPORT

Pagina 3 van 3

Opdrachtcode ACMAA Almelo: A120300007b

Globale situatietekening

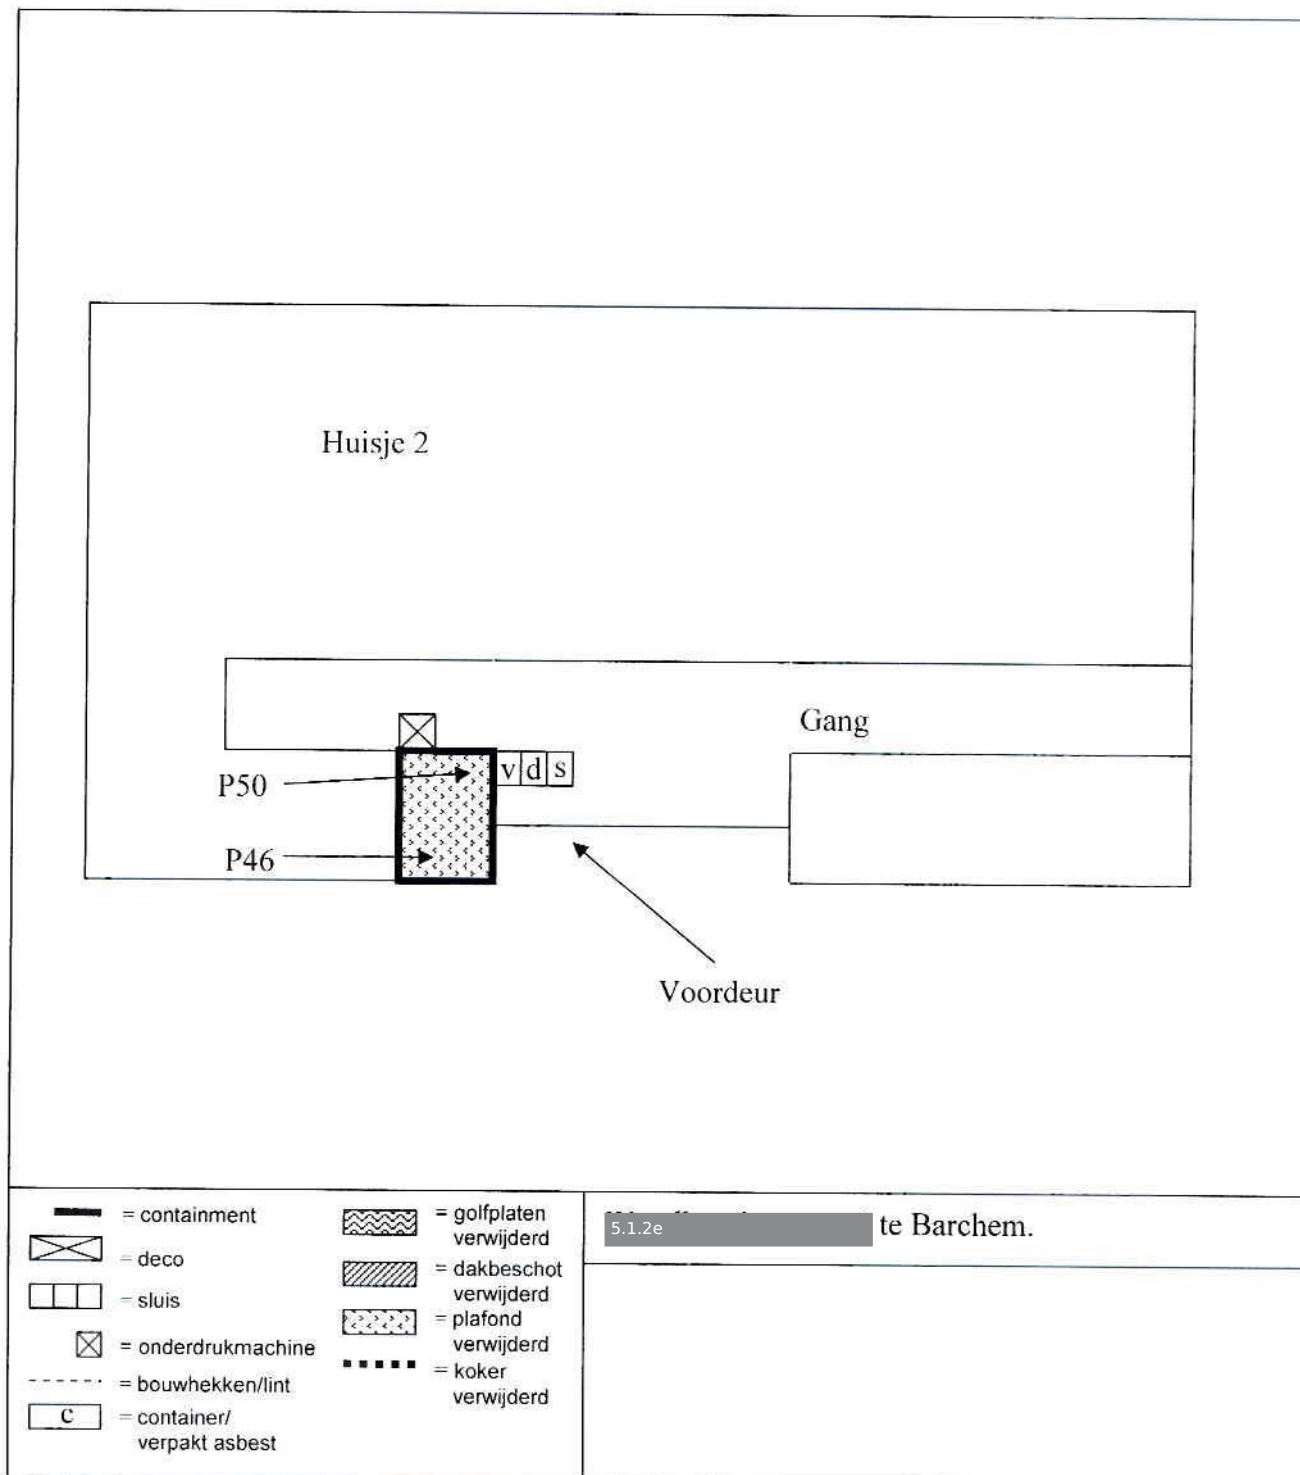

HET LABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR INSPECTIE INSTELLING
ONDER NR. L376 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHRIJVEN IN DE ACCREDITATIE

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	5
